



EPMMOP
 Empresa Pública
 Metropolitana
 de Movilidad y
 Obras Públicas

PARA: Ingeniero Germánico Pinto T.
 Gerente General

ASUNTO: Informe Alcalde diciembre 2011

FECHA: 28 DIC. 2011

No. 01690 GPM

Adjunto a la presente el avance de los principales proyectos desarrollados por la EPMMOP, correspondiente al mes de diciembre del año en curso, para conocimiento del Señor Alcalde. Esta información ha sido verificada y depurada con cada una de las gerencias de la Empresa.

Eco. Juan Carlos Herrera M.
 Gerente de Planificación de la Movilidad

Adjunto: 8 hojas

Elaborado por	Carolina Gómez
Bajo la responsabilidad de	Jorge Vaca
Revisado por	Patricia Celi
Actualizado por	Jaime Rivera Roberto Gabela Armando Sánchez Edgar Jácome Santiago Játiva Xavier Arroyo

7.
 Peli.
 J.
 F.

2011-12-27


EPMMOP QUITO GERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD EMMOP-Q
 FECHA:
 SECRETARIA

EPMMOP Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas
 GERENCIA GENERAL
 30 DIC 2011

CUADRO RESUMEN EPMMOP


CLASIFICACIÓN DE OBRAS POR ESTADO				
ESTADO *	No	%	MONTO	%
EJECUCIÓN	45	16.73%	69,559,857.17	19.02%
PROCESO	72	26.77%	237,590,660.15	64.97%
CONCLUIDOS	144	53.53%	53,749,872.59	14.70%
SUSPENDIDOS	8	2.97%	4,799,236.41	1.31%
TOTAL PROYECTOS	269	100.00%	365,699,626.32	100.00%

- * Los proyectos en ejecución son los que han sido asignados y en este momento se encuentran ejecutándose
- * Los proyectos en proceso se refieren a los que se encuentran en proceso de estudios, contratación, asignación de presupuestos
- * Los proyectos concluidos son los que se han terminado

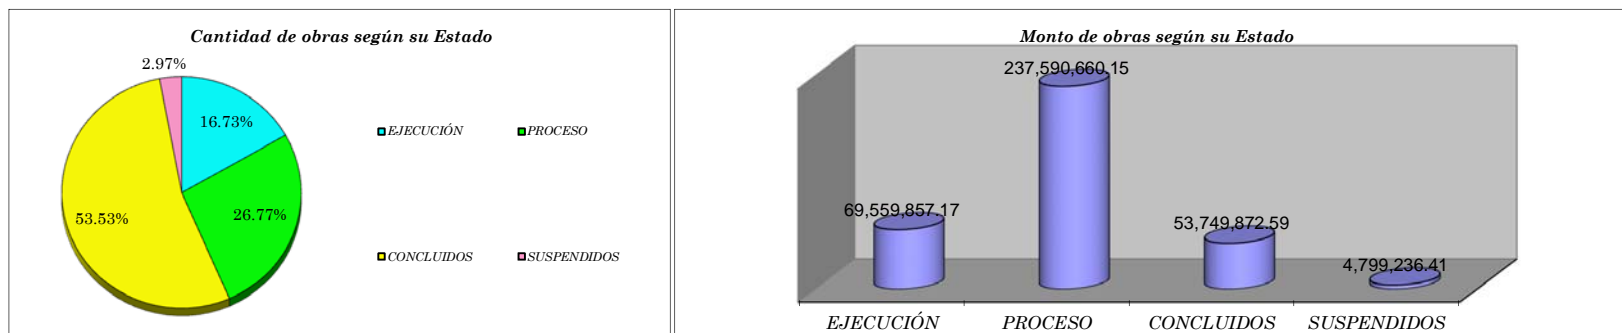

CLASIFICACIÓN DE OBRAS POR TAMAÑO					
TAMAÑO	RANGO A TOMAR EN CUENTA EN UDS. *	No.	%	MONTO	%
OBRAS PEQUEÑAS	Hasta 146.000	145	53.90%	7,640,433.77	2.09%
OBRAS MEDIANAS	De 146.000 a 638.000	83	30.86%	27,164,645.46	7.43%
OBRAS GRANDES	De 638.000 en adelante	41	15.24%	330,894,547.09	90.48%
TOTAL		269	100.00%	365,699,626.32	100.00%

* Según clasificación del INCOP (montos redondeados)

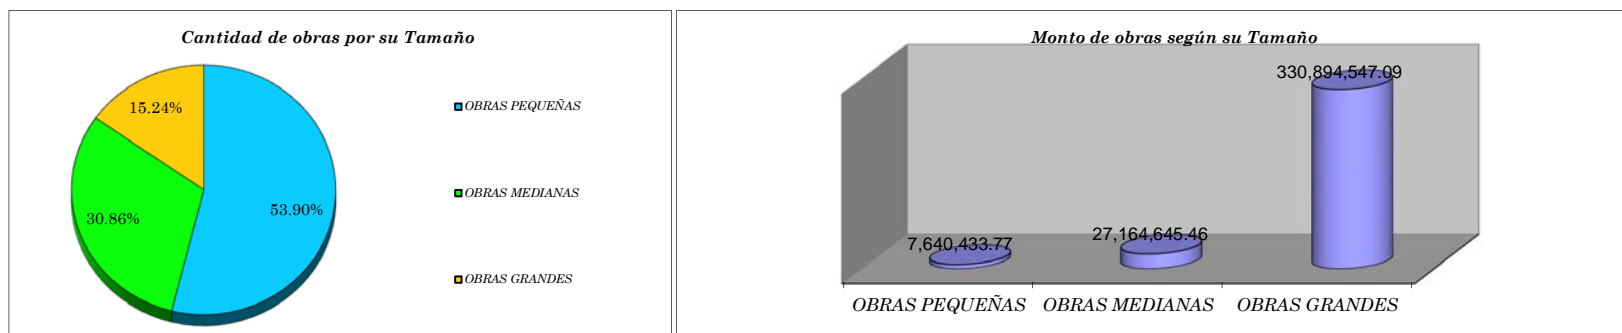



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
ING. GERMANICO PINTO TROYA
GERENTE GENERAL



N.	Código	Nombre del proyecto	Unidad de medida	Cantidad	Tipo de obra	Subtipo de obra	Adm. Zonal responsable	Ubicación Parroquia	Barrio	Ámbito Territorial (Aplica parroquias rurales)	Costo del proyecto	Presupuesto 2011	Contratista	Fecha de entrega de estudios	Inicio de Obra	Fin de Obra	Observaciones	Estado	Reporta	Tamaño	Longitud	Latitud
1	EPMMOP-1-DMQ	Compra de 80 buses articulados para el Corredor Suroriental	unidad	80	Movilidad y Transporte	Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial del SIT Metrobús-Q	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 24,500,000.00	\$ 24,500,000.00	IMPOBUS	NA	01-Abr-10	30-Jun-11	La entrega de la flota se ha completado en un 100%. Operación y mantenimiento de buses a cargo de EPMMOP según Convenio Interinstitucional EPMMOP y EPMPQ de 10 de mayo 2011.	C	GGM	G	NA	NA
2	EPMMOP-2-QUI-04-U	Construcción de Talleres de Mantenimiento de la Flota de Buses Articulados Terminal Quitumbe	m2	Por definir	Movilidad y Transporte	Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial del SIT Metrobús-Q	Quitumbe	Quitumbe	Quitumbe		\$ 2,913,770.16	\$ 2,913,770.16	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	En proceso expropiación de los predios en los que ubicarán los Talleres junto al Terminal Terrestre Quitumbe	P	GOP	G	-78.55600000	-0.29562900
3	EPMMOP-3-DMQ	Vía de acceso al NAQ (Collas - Terminal Aérea)	km		Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 383,340.00	\$ 235,340.00	GEOVIAL Consultores Nacionales Cía. Ltda.	Feb-11	NA	NA	MTOP suscribió contrato de construcción con PANAVIAL el 18 de agosto del 2011	C	UPEV	M	-78.37680000	-0.10458000
4	EPMMOP-4-DMQ	Estudios Monjas - Vicentina - San Juan Alto	unidad	1	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 499,741.50	\$ 433,109.30	Asociación LG - C & TECH-INDETEC	Abr-12	NA	NA	Estudios en ejecución. Los Estudios Geológicos sugieren buscar alternativas para el trazado vial. El consultor presentará esas alternativas en el siguiente informe.	E	UPEV	M	-78.47990000	-0.21461400
5	EPMMOP-5-DMQ	Estudios de Ingeniería: Miranda - Simón Bolívar	unidad	1	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 0.00		NA		NA	NA	Los estudios de ingeniería del tramo Miranda - Simón Bolívar fueron enviados al Consejo Provincial de Pichincha.	C	UPEV	P	-78.51880000	-0.32535000
6	EPMMOP-6-DMQ	Estudios de Ingeniería: Escalón 2	unidad	1	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 260,000.00	\$ 160,000.00	Por definir	Dic-12	NA	NA	Estudios definitivos de ingeniería en proceso precontractual	P	UPEV	M	-78.51880000	-0.32535000
7	EPMMOP-7-QUI-02-U	Estudios Prolongación Mariscal Sucre (Ecuatoriana - INIAP)	unidad	1	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	Quitumbe	Guamáni	Varios		\$ 260,000.00	\$ 100,000.00	Por definir	Oct-12	NA	NA	Estudios definitivos de ingeniería en proceso precontractual	P	UPEV	M	-78.55550000	-0.33290600
8	EPMMOP-8-DMQ	Estudios Perimetral Metropolitana (Tramo Autopista Rumiñahui - Gualo)	unidad	1	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 799,054.40	\$ 693,333.33	Asociación LG - C & TECH-INDETEC	Abr-12	NA	NA	Estudios en ejecución	E	UPEV	G	-78.46860000	-0.25747000
9	EPMMOP-9-DMQ	Estudios definitivos de la Prolongación vía Simón Bolívar, La Marca (Corredor Vial Nor-Oriental)	unidad	1	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 566,000.00	\$ 466,000.00	Asociación ASTEC, Fernando Romo y León Godoy.	22-Jun-11	NA	NA	Estudios concluidos, se inicia trámites para proceso de expropiaciones.	C	GOP	M	-78.44590000	-0.04499880
10	EPMMOP-10-DMQ	Estudios definitivos Ruta VIVA (Ruta Sur) Vía Aeropuerto (Corredor Vial Centro Oriental)	unidad	1	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 1,353,659.56	\$ 1,353,659.56	Asociación ASTEC, Fernando Romo y León Godoy.	17-Sep-11	NA	NA	Tramo 1: Concluido, para aprobación CAF; Tramo 2: Concluido.	C	GOP	G	-78.39390000	-0.22098100
11	EPMMOP-11-DMQ	Construcción Ruta VIVA (Ruta Sur) Vía Aeropuerto (Corredor Vial Centro Oriental)	km	12.8	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 152,744,862.00	Por definir	Por definir	Estudios entregados	Por definir		Tramo 1: Aprobado por CAF; Tramo 2: Concluido, en trámite para aprobación CAF.	P	GOP	G	-78.39390000	-0.22098100
12	EPMMOP-12-DMQ	Estudios Ruta Ontaneda	unidad	1	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 0.00		NA				A cargo del Consejo Provincial	P		P	-78.50930000	-0.29182100
13	EPMMOP-13-DMQ	Ampliación de la Panamericana Norte y Sur	km		Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 0.00		NA				A cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas	P		P	-78.40820000	-0.10079000
14	EPMMOP-14-DMQ	Carretera E-35 con acceso a las parroquias	km		Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 0.00		NA				A cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas	P		P	-78.33730000	-0.27239000
15	EPMMOP-15-TUM-08-R	Nuevo puente sobre el Río Chiche, Vía Interoceánica	m		Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	Tumbaco	Tumbaco		Periférico rural	\$ 0.00		NA				A cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas	P		P	-78.36910000	-0.21079700



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
ING. GERMANICO PINTO TROYA
GERENTE GENERAL



N.	Código	Nombre del proyecto	Unidad de medida	Cantidad	Tipo de obra	Subtipo de obra	Adm. Zonal responsable	Ubicación Parroquia	Barrio	Ámbito Territorial (Aplica parroquias rurales)	Costo del proyecto	Presupuesto 2011	Contratista	Fecha de entrega de estudios	Inicio de Obra	Fin de Obra	Observaciones	Estado	Reporta	Tamaño	Longitud	Latitud
16	EPMMOP-16-DMQ	Estudios ampliación de la capacidad vial y mejoramiento del nivel de servicio de la Av. Mariscal Sucre, sector norte (fase 1)	unidad	1	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 360,000.00	\$ 350,000.00	VIASTRA	Por definir	NA	NA	Intercambiador en Condado. Estudios concluidos y aprobados por BdE, al momento se encuentra en proceso de contratación de la obra. Intercambiador Rumihurco: Proceso de contratación de los estudios en el Portal Compras públicas. Intercambiador Legarda: fue rediseñado y pasó de intercambiador a reforma geométrica, diseños y ejecución se realizarán por Administración Directa. Intercambiador Fernández Salvador: estudios enviados al BdE. Viaducto Jorge Piedra Valdivieso: en rediseños. Rehabilitación de la calzada tramo Miraflores - Carcelén: Estudio aprobado por el BdE, al momento se encuentra en proceso de contratación de la obra.	E	GOP	M	-78.50190000	-0.13360700
17	EPMMOP-17-DMQ	Estudios ampliación de la capacidad vial y mejoramiento del nivel de servicio de la Av. Mariscal Sucre, sector Sur (fase 2)	unidad	1	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 230,000.00	\$ 230,000.00	GEOVIAL Consultores Nacionales Cía. Ltda.	15-May-11	NA	NA	Los estudios de los intercambiadores La Mena, Alonso de Angulo y Rodrigo de Chávez se encuentran concluidos.	C	GOP	M	-78.53670000	-0.24912100
18	EPMMOP-18-DEL-05-U	Nuevo acceso noroccidental a Pisulí y Roldós	km	3	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	La Delicia	El Condado	Pisulí y Roldós		\$ 2,742,093.90	\$ 2,742,093.90	Menatlas Quito C. A.	05-Oct-10	15-Jun-11	16-Abr-12	La Dirección Metropolitana de Catastros, emitió informe de valoración, procuraduría prepara criterio jurídico para declaratoria de utilidad pública, con la cual se conseguirá la licencia forestal que permitirá el reinicio de la obra.	S	GOP	G	-78.51480000	-0.10560700
19	EPMMOP-19-DEL-05-U	Ampliación calle Rumihurco	m2	#####	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	La Delicia	El Condado	San José del Condado		\$ 1,291,192.91	\$ 1,291,192.91	Menatlas Quito C. A.	05-Oct-10	28-Jul-11	23-Feb-12	En ejecución (34%)	E	GOP	G	-78.49720000	-0.09988480
20	EPMMOP-20-DEL-05-U	Intercambiador Av. Mariscal Sucre y Calle Machala	unidad	1	Movilidad y Transporte	Reformas Geométricas Mayores	La Delicia	El Condado	Mena del Hierro		\$ 1,517,828.59	\$ 1,517,828.59	Bueno & Castro Cía. Ltda. (Ing. Ramón Castro)	05-Oct-10	21-Oct-11	08-Abr-12	En ejecución (10%)	E	GOP	G	-78.50470000	-0.11219500
21	EPMMOP-21-TUM-02-R	Estudios Ampliación Vía Interoceánica tramo: La Lira - Puente San Pedro	unidad	1	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	Tumbaco	Cumbayá		Periférico rural	\$ 722,000.00	\$ 722,582.80	INEXTEX Cía. Ltda.	Por definir	NA	NA	Estudios concluidos de Intercambiador Bañistas, Auqui, y Escalón Lumbisi. Por entregarse hasta febrero vía Escénica y paso elevado vía antigua Cumbavá.	E	GOP	G	-78.45030000	-0.25687800
22	EPMMOP-22-TUM-02-R	Construcción de la Ampliación Vía Interoceánica: Intercambiador Bañistas	unidad	1	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	Tumbaco	Cumbayá		Periférico rural	\$ 0.00				01-Nov-11	11-Jun-12	La constructora continua con los trabajos preliminares (reubicación- sistema de alcantarillado). Se mantienen reuniones con la comunidad a efectos de solucionar posibles problemas que se generan con la construcción de la obra. En lo referente a expropiaciones, se gestiona la firma de convenios con los frentistas, la Dirección de Catastros emitirá el informe de valoración en los próximos días.	P	GOP	P	-78.43719167	-0.19807778



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
ING. GERMANICO PINTO TROYA
GERENTE GENERAL



N.	Código	Nombre del proyecto	Unidad de medida	Cantidad	Tipo de obra	Subtipo de obra	Adm. Zonal responsable	Ubicación Parroquia	Barrio	Ámbito Territorial (Aplica parroquias rurales)	Costo del proyecto	Presupuesto 2011	Contratista	Fecha de entrega de estudios	Inicio de Obra	Fin de Obra	Observaciones	Estado	Reporta	Tamaño	Longitud	Latitud
23	EPMMOP-23-TUM-02-R	Construcción de la Ampliación Vía Interoceánica: Intercambiador Auqui Primavera	unidad	1	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	Tumbaco	Cumbayá		Periférico rural	\$ 0.00				Por definir	Por definir	Los trabajos a ejecutar se iniciarían en Enero 2012, debido a problemas de expropiación con los afectados que se han opuesto al proyecto; la Dirección de Catastros deberá emitir un informe para la declaratoria de utilidad pública, este informe será expedido en los próximos días.	P	GOP	P	-78.44246667	-0.21436667
24	EPMMOP-24-ELO-02-U	Construcción de obras complementarias Chiriyacu	m2	760	Movilidad y Transporte	Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial del SIT Metrobús-Q	Eloy Alfaro	Chimacalle	El Camal		\$ 96,874.58	\$ 33,278.94	Ing. Pillajo Chiliguano Juan Carlos	Estudios entregados	15-Oct-10	12-Feb-11	Concluida	C	GOP	P	-78.52000000	-0.25068200
25	EPMMOP-25-CHI-03-R	Adoquinado Calle Lizardo García Tramo 2, Conocoto Alto	m2	2,369.40	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Los Chillos	Conocoto	Conocoto Alto	Urbano parroquial	\$ 102,868.25	\$ 102,868.25	Ing. Naranjo Guambo Marco Antonio	17-Feb-10	01-Feb-11	01-Jul-11	Concluida	C	GOP	P	-78.56770000	-0.33701700
26	EPMMOP-26-CHI-03-R	Adoquinado Calle Lizardo García Tramo 3, Conocoto Alto	m2	5,040.06	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Los Chillos	Conocoto	Conocoto Alto	Urbano parroquial	\$ 91,128.72	\$ 91,128.72	Ing. López Guambo Diego	17-Feb-10	24-Ene-11	23-Jun-11	Concluida	C	GOP	P	-78.50040000	-0.27070000
27	EPMMOP-27-DEL-13-R	Adoquinado Calle Padre Rumi Tramo 2, San Antonio de Pichincha	m2	6,110.92	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	La Delicia	San Antonio de Pichincha	Central	Urbano parroquial	\$ 103,620.10	\$ 40,977.98	Ing. Rodríguez Cruz Diego Javier	04-Ago-10	17-Dic-10	16-Mar-11	Concluida	C	GOP	P	-78.45420000	0.00307452
28	EPMMOP-28-DEL-12-U	Adoquinado Calle de Los Escultores, Parques del Recuerdo	m2	600.00	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	La Delicia	Ponceano	La Granja		\$ 21,421.00	\$ 21,421.00	INDUBLOCK Cia. Ltda.	12-Ago-10	15-Feb-11	16-Abr-11	Concluida	C	GOP	P	-78.48260000	-0.11654600
29	EPMMOP-29-SAE-04-U	Adoquinado Calle F (S5), Barrio Eloy Alfaro de Puengasí	m2	1,218.42	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Manuela Sáenz	Puengasí	Eloy Alfaro de Puengasí		\$ 34,703.38	\$ 34,703.38	DUVALEN Cia. Ltda.	25-Ago-10	10-Ene-11	24-Feb-11	Concluida	C	GOP	P	-78.49240000	-0.24190200
30	EPMMOP-30-SAE-04-U	Adoquinado Calle Cordillera del Cóndor, Barrio Balcón del Valle	m2	361.41	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Manuela Sáenz	Puengasí	Balcón del Valle		\$ 14,171.38	\$ 14,171.38	Arq. Sarzosa Riera Vicente Carlos	04-Ago-10	24-Ene-11	10-Mar-11	Concluida	C	GOP	P	-78.49710788	-0.23207594
31	EPMMOP-31-ELO-04-U	Adoquinado Calle 2, Barrio San Patricio de Puengasí	m2	4,842.82	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Eloy Alfaro	La Ferroviaria	San Patricio de Puengasí		\$ 126,528.76	\$ 126,528.76	Arq. Abambari Guachamín Juan Carlos	Estudios entregados	08-Dic-10	07-Mar-11	Concluida	C	GOP	P	-78.50200000	-0.25367300
32	EPMMOP-32-ELO-04-U	Adoquinado Calle 3, Barrio San Patricio de Puengasí	m2	2,230.32	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Eloy Alfaro	La Ferroviaria	San Patricio de Puengasí		\$ 60,344.41	\$ 40,909.75	Arq. Yacelga Quiña Patricio Xavier	Estudios entregados	25-Nov-10	22-Feb-11	Concluida	C	GOP	P	-78.50120000	-0.25269500
33	EPMMOP-33-CHI-03-R	Adoquinado Calle Emilio Estrada, Barrio Santa Teresita del Valle	m2	2,369.40	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Los Chillos	Conocoto	Santa Teresita del Valle	Urbano parroquial	\$ 73,264.65	\$ 73,264.65	Ing. Cerda Albuja Edwin Roberto	04-Ago-10	17-Ene-11	16-Jun-11	Concluida	C	GOP	P	-78.49890000	-0.26359400
34	EPMMOP-34-CHI-03-R	Adoquinado Calle José Cuero y Caicedo, Barrio Santa Teresita del Valle	m2	2,128.98	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Los Chillos	Conocoto	Santa Teresita del Valle	Urbano parroquial	\$ 67,627.36	\$ 67,627.36	Ing. Tapia Escobar Rubén Darío	04-Ago-10	03-Ene-11	04-Mar-11	Concluida	C	GOP	P	-78.49890000	-0.26042900
35	EPMMOP-35-CHI-03-R	Adoquinado Calle H (José Abascal), Barrio Hospitalaria	m2	1,680.00	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Los Chillos	Conocoto	Hospitalaria	Urbano parroquial	\$ 52,091.71	\$ 52,091.71	GRAVACONS Cia. Ltda.	04-Ago-10	23-Feb-11	Por definir	En trámite la rescisión del contrato por mutuo acuerdo, ya que los trabajos de la EPMAPS se mantendrán por un periodo largo.	S	GOP	P	-78.47230000	-0.27824100
36	EPMMOP-36-DEL-13-R	Adoquinado Calle Lulumbamba, San Antonio de Pichincha	m2	2,891.01	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	La Delicia	San Antonio de Pichincha	Central	Urbano parroquial	\$ 73,301.40	\$ 73,301.40	Ing. Rodríguez Cruz Diego Javier	04-Ago-10	23-Dic-10	20-Feb-11	Concluida	C	GOP	P	-78.44270000	-0.00877218



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
ING. GERMANICO PINTO TROYA
GERENTE GENERAL



N.	Código	Nombre del proyecto	Unidad de medida	Cantidad	Tipo de obra	Subtipo de obra	Adm. Zonal responsable	Ubicación Parroquia	Barrio	Ámbito Territorial (Aplica parroquias rurales)	Costo del proyecto	Presupuesto 2011	Contratista	Fecha de entrega de estudios	Inicio de Obra	Fin de Obra	Observaciones	Estado	Reporta	Tamaño	Longitud	Latitud
37	EPMMOP-37-DEL-02-U	Adoquinado Perimetral Tramo 1, Carcelén Bajo	m2	8,990.00	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	La Delicia	Carcelén	Carcelén Bajo		\$ 186,715.35	\$ 186,715.35	Ing. Paucarina Bahamonde Jhony Paul	12-Ago-10	22-Feb-11	05-Ene-12	Se está ejecutando el contrato complementario por la construcción de muro de gaviones que se encuentra con un avance del 65%.	E	GOP	M	-78.46390000	-0.07344140
38	EPMMOP-38-QUI-04-U	Adoquinado Calle 3 (S33), Tambolacta, Quitumbe	m2	904.59	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Quitumbe	Quitumbe	Tambolacta		\$ 28,132.29	\$ 24,205.62	Arq. Orquera Maldonado Washington Renán	04-Ago-10	09-Dic-10	06-Feb-11	Concluida	C	GOP	P	-78.54450000	-0.28942000
39	EPMMOP-39-QUI-01-U	Adoquinado Calles E, F, G, San Luis de Chillogallo	m2	2,082.68	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Quitumbe	Chillogallo	San Luis de Chillogallo		\$ 58,376.19	\$ 58,376.19	Ing. Chiriboga Sandoval Wilson Edison	13-Jul-10	15-Dic-10	12-Feb-11	Concluida	C	GOP	P	-78.56930000	-0.27396900
40	EPMMOP-40-QUI-01-U	Adoquinado Calle C (S31), Venceremos	m2	527.56	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Quitumbe	Chillogallo	Venceremos		\$ 13,547.08	\$ 3,302.11	Ing. Venegas Bustillos Rolando Enrique	06-Ago-10	25-Nov-10	08-Ene-11	Concluida	C	GOP	P	-78.56540000	-0.27117700
41	EPMMOP-41-QUI-01-U	Adoquinado Calles F y H, San Mateo	m2	1,553.14	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Quitumbe	Chillogallo	San Mateo		\$ 47,257.76	\$ 47,257.76	Arq. Sarzosa Riera Vicente Carlos	06-Ago-10	10-Mar-11	24-Abr-11	Concluida	C	GOP	P	-78.56580000	-0.27792100
42	EPMMOP-42-DEL-05-U	Adoquinado Transversal A X (N74D), Colinas del Norte	m2	2,301.21	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	La Delicia	El Condado	Colinas del Norte		\$ 75,197.66	\$ 75,197.66	Ing. Larrea Narváez Fernando Ramiro	25-Ago-10	11-Feb-11	12-Abr-11	Concluida	C	GOP	P	-78.51880000	-0.09935770
43	EPMMOP-43-DEL-05-U	Adoquinado Transversal A XII, Colinas del Norte	m2	1,877.08	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	La Delicia	El Condado	Colinas del Norte		\$ 61,787.36	\$ 61,787.36	Ing. Polanco Verdesoto José Patricio	25-Ago-10	11-Feb-11	12-Abr-11	Concluida	C	GOP	P	-78.51940000	-0.10012000
44	EPMMOP-44-QUI-03-U	Adoquinado Calle Ermel Fiallos Tramo 1, Martha Bucaram	m2	2,323.22	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Quitumbe	La Ecuatoriana	Martha Bucaram		\$ 64,779.33	\$ 50,381.62	Ing. Hidalgo Albuja Mario Patricio	06-Ago-10	09-Dic-10	08-Mar-11	Concluida	C	GOP	P	-78.56550000	-0.30585700
45	EPMMOP-45-QUI-03-U	Adoquinado Pasaje Yurac, Martha Bucaram	m2	583.71	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Quitumbe	La Ecuatoriana	Martha Bucaram		\$ 22,907.21	\$ 22,907.21	Arq. Sarzosa Riera Vicente Carlos	06-Ago-10	30-Dic-10	28-Feb-11	Concluida	C	GOP	P	-78.56590000	-0.30574900
46	EPMMOP-46-QUI-03-U	Adoquinado Calle Juan Vásquez Tramo 2, Pasaje Beto Tramo 1, Martha Bucaram	m2	910.00	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Quitumbe	La Ecuatoriana	Martha Bucaram		\$ 31,404.11	\$ 31,404.11	Ing. Calderón del Hierro Carlos Xavier	06-Ago-10	27-Dic-10	24-Feb-11	Concluida	C	GOP	P	-78.56620000	-0.30637300
47	EPMMOP-47-DEL-03-U	Adoquinado Calle 29 de Mayo, Comité del Pueblo	m2	655.00	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	La Delicia	Comité del Pueblo	Comité del Pueblo		\$ 23,692.56	\$ 23,692.56	Ing. Muñoz Játiva Aníbal	12-Ago-10	21-Dic-10	18-Feb-11	Concluida	C	GOP	P	-78.45910000	-0.11580000
48	EPMMOP-48-QUI-02-U	Adoquinado Calle A, Barrio La Esperanza, Guamaní	m2	1,386.35	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Quitumbe	Guamaní	La Esperanza		\$ 39,175.91	\$ 39,175.91	Ing. Calderón del Hierro Carlos Xavier	12-Ago-10	23-Dic-10	20-Feb-11	Concluida	C	GOP	P	-78.56770000	-0.33701700
49	EPMMOP-49-QUI-03-U	Adoquinado Calle 4, Barrio Primicias de La Cultura	m2	1,969.78	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Quitumbe	La Ecuatoriana	Primicias de La Cultura		\$ 59,440.02	\$ 59,440.02	Ing. Córdova Jiménez Fabián Eduardo	12-Ago-10	17-Ene-11	18-Mar-11	Concluida	C	GOP	P	-78.56190000	-0.29500000
50	EPMMOP-50-QUI-03-U	Adoquinado Calle de La Iglesia S37E, Barrio Primicias de La Cultura	m2	1,969.78	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Quitumbe	La Ecuatoriana	Primicias de La Cultura		\$ 52,983.92	\$ 52,983.92	Ing. Almendáriz Romero Tito Marcelo	12-Ago-10	30-Dic-10	27-Feb-11	Concluida	C	GOP	P	-78.56070000	-0.29546500
51	EPMMOP-51-EUG-15-U	Adoquinado Calle C, Pasajes D y E, Barrio Campiña del Inca	m2	1,583.12	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Eugenio Espejo	San Isidro del Inca	Campiña del Inca		\$ 50,925.06	\$ 50,925.06	Ing. Quiñónez Chuquitarco Galo Vinicio	6-Ago-10	14-Mar-11	12-May-11	Concluida	C	GOP	P	-78.45280000	-0.14385700
52	EPMMOP-52-EUG-15-U	Adoquinado Calle 4, Barrio Quintana	m2	1,137.86	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Eugenio Espejo	San Isidro del Inca	Quintana		\$ 23,920.48	\$ 23,920.48	Ing. Córdova Jiménez Fabián Eduardo	12-Ago-10	13-Dic-10	26-Ene-11	Concluida	C	GOP	P	-78.45980000	-0.12748300
53	EPMMOP-53-EUG-15-U	Adoquinado Calle 6 y Pasaje 1, Barrio Quintana	m2	1,137.86	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Eugenio Espejo	San Isidro del Inca	Quintana		\$ 32,661.85	\$ 32,661.85	Arq. Abambari Guachamín Juan Carlos	12-Ago-10	18-Feb-11	03-Abr-11	Concluida	C	GOP	P	-78.46050000	-0.12701000
54	EPMMOP-54-SAE-02-U	Adoquinado Pasaje Ninahualpa, Guápulo	m2	600.19	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Manuela Sáenz	Itchimbia	Guápulo		\$ 23,126.01	\$ 4,803.67	Arq. Yacelga Quiña Patricio Xavier	4-Ago-10	25-Nov-10	08-Ene-11	Concluida	C	GOP	P	-78.47550000	-0.20428500
55	EPMMOP-55-SAE-05-U	Reparación Adoquinado Calle Juan Soto, Toctiuco	m2	377.10	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Manuela Sáenz	San Juan	Toctiuco		\$ 19,347.49	\$ 19,347.49	Ing. Calderón del Hierro Carlos Xavier	12-Ago-10	22-Dic-10	04-Feb-11	Concluida	C	GOP	P	-78.52370000	-0.21120100



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
ING. GERMANICO PINTO TROYA
GERENTE GENERAL



N.	Código	Nombre del proyecto	Unidad de medida	Cantidad	Tipo de obra	Subtipo de obra	Adm. Zonal responsable	Ubicación Parroquia	Barrio	Ámbito Territorial (Aplica parroquias rurales)	Costo del proyecto	Presupuesto 2011	Contratista	Fecha de entrega de estudios	Inicio de Obra	Fin de Obra	Observaciones	Estado	Reporta	Tamaño	Longitud	Latitud
56	EPMMOP-56-CHI-03-R	Adoquinado Pasaje Galileo, Conocoto	m2	1,262.91	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Los Chillos	Conocoto	Central	Urbano parroquial	\$ 45,379.48	\$ 45,379.48	Arq. Berni Pinto Álvaro Clemente	12-Ago-10	04-May-11	07-Jul-11	Concluida	C	GOP	P	-78.48490000	-0.28599700
57	EPMMOP-57-CHI-03-R	Adoquinado Calle El Girón, Conocoto	m2	1,189.74	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Los Chillos	Conocoto	Central	Urbano parroquial	\$ 33,524.27	\$ 33,524.27	Ing. Montalvo Hurtado Marcia Cecilia	12-Ago-10	03-Ene-11	17-Feb-11	Concluida	C	GOP	P	-78.48690000	-0.30049000
58	EPMMOP-58-SAE-03-U	Adoquinado Calles 22 de Enero, 16 de Junio, 3 de Marzo, Barrios El Cano Velasco desde La Escuela O'Leary hacia Los Angeles	m2	8,479.55	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Manuela Sáenz	La Libertad	Varios		\$ 165,599.67	\$ 165,599.67	Ing. Condo Ramirez Segundo Rodrigo	12-Ago-10	14-Mar-11	11-Ago-11	Concluida	C	GOP	M	-78.52890000	-0.21523500
59	EPMMOP-59-TUM-08-R	Adoquinado Calles "A" Desde Gonzalo Pizarro Hasta Calle B y Calle "B" Desde Calle A Hasta Abscisa 0+044, Barrio Santa Rosa	m2	2,672.23	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Tumbaco	Tumbaco	Santa Rosa	Urbano parroquial	\$ 69,951.05	\$ 69,951.05	Arq. Tintín Gómez Daniel Emiliano	14-Sep-10	09-Feb-11	09-May-11	Concluida	C	GOP	P	-78.40170000	-0.20752600
60	EPMMOP-60-TUM-06-R	Adoquinado Pasaje Francisco Ruiz desde Manuel Burbano (E6) hasta Luis Carrera (E4E), Barrio Central	m2	734.83	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Tumbaco	Puembuco	Barrio Central	Urbano parroquial	\$ 26,559.02	\$ 26,559.02	CONSTCOMERGON S. A.	14-Sep-10	21-Mar-11	04-May-11	Concluida	C	GOP	P	-78.36160000	-0.17386000
61	EPMMOP-61-TUM-06-R	Adoquinado Calle Andrade Marín (E8) desde 10 de Agosto (S3) hasta Fin de Calle, Barrio Central	m2	1,386.80	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Tumbaco	Puembuco	Barrio Central	Urbano parroquial	\$ 44,310.03	\$ 44,310.03	Ing. Venegas Bustillos Rolando Enrique	14-Sep-10	31-Ene-11	1-Abr-11	Concluida	C	GOP	P	-78.35750000	-0.17613200
62	EPMMOP-62-TUM-02-R	Adoquinado Calle María Clara desde Pasaje Segundo Salazar hasta Abscisa 0+165, Barrio Rojas	m2	1,132.28	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Tumbaco	Cumbayá	Barrios Rojas	Urbano parroquial	\$ 31,623.42	\$ 31,623.42	Ing. Salazar Garrido Luis Marcelo	14-Sep-10	11-Mar-11	10-May-11	Concluida	C	GOP	P	-78.42800000	-0.21566600
63	EPMMOP-63-TUM-02-R	Adoquinado Calle Las Orquídeas desde Via Férrea hasta Pasaje G, Barrio San Francisco Pinsha	m2	1,237.98	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Tumbaco	Cumbayá	San Francisco Pinsha	Urbano parroquial	\$ 34,898.08	\$ 34,898.08	Arq. Vásquez Chipantaxi Washington Enrique	14-Sep-10	14-Mar-11	12-May-11	Concluida	C	GOP	P	-78.45710000	-0.21821700
64	EPMMOP-64-TUM-01-R	Adoquinado Calle Josefina Serrano desde Calle Quito hasta Abscisa 0+313, Barrio Selva Alegre	m2	2,470.24	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Tumbaco	Checa	Selva Alegre	Urbano parroquial	\$ 73,851.49	\$ 73,851.49	Ing. Buitrón Garrido Jaime Vinicio	14-Sep-10	22-Mar-11	19-Jun-11	Concluida	C	GOP	P	-78.35750000	-0.17613200
65	EPMMOP-65-TUM-07-R	Adoquinado Calle La Condamine desde Calle 29 de Abril hasta Calle Justo Coello, Barrio Central	m2	2,301.21	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Tumbaco	Tababela	Barrio Central	Urbano parroquial	\$ 63,865.62	\$ 63,865.62	Ing. Ledesma Alarcón Marcos Absalón	14-Sep-10	25-Mar-11	22-Jun-11	Concluida	C	GOP	P	-78.42800000	-0.21566600
66	EPMMOP-66-TUM-05-R	Adoquinado Calle Oriente desde Calle Felicísimo Vega hasta fin Bordillos, Barrio Olalla	m2	651.00	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Tumbaco	Pifo	Olalla	Urbano parroquial	\$ 15,260.71	\$ 15,260.71	Ing. Venegas Bustillos Rolando Enrique	14-Sep-10	10-Dic-10	23-Ene-11	Concluida	C	GOP	P	-78.33055230	-0.23586760
67	EPMMOP-67-TUM-05-R	Adoquinado Pasaje Sin Nombre desde Pasaje San Javier hasta Fin de Pasaje, Barrio El Progreso	m2	886.00	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Tumbaco	Pifo	El Progreso	Urbano parroquial	\$ 25,184.53	\$ 25,184.53	Arq. Amaya Canelos Francisco Gabriel	14-Sep-10	11-Ene-11	24-Feb-11	Concluida	C	GOP	P	-78.45710000	-0.21821700
68	EPMMOP-68-TUM-05-R	Adoquinado Calle Rafael Losa desde Pasaje San Javier hasta fin de Pasaje, Barrio El Progreso	m2	886.00	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Tumbaco	Pifo	El Progreso	Urbano parroquial	\$ 32,492.50	\$ 32,492.50	Ing. Pérez Torres Guido Patricio	14-Sep-10	23-Dic-10	20-Feb-11	Concluida	C	GOP	P	-78.33610000	-0.22383000



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
ING. GERMANICO PINTO TROYA
GERENTE GENERAL



N.	Código	Nombre del proyecto	Unidad de medida	Cantidad	Tipo de obra	Subtipo de obra	Adm. Zonal responsable	Ubicación Parroquia	Barrio	Ámbito Territorial (Aplica parroquias rurales)	Costo del proyecto	Presupuesto 2011	Contratista	Fecha de entrega de estudios	Inicio de Obra	Fin de Obra	Observaciones	Estado	Reporta	Tamaño	Longitud	Latitud
69	EPMMOP-69-TUM-09-R	Construcción de bordillos y reempedrado Calle Quito desde Panamericana hasta Quebrada Santa Rosa y reempedrado acceso a Chinangachi desde Panamericana hasta abscisa 1+500, Barrios Santa Rosa, La Joya y Chinangachi	m/m2	(2,900.00) / (4,426.00)	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Tumbaco	Yaruquí	Varios	Periférico rural	\$ 68,357.78	\$ 68,357.78	Ing. Díaz Játiva Reinaldo Pablo	14-Sep-10	18-Feb-11	19-May-11	Concluida	C	GOP	P	-78.31510000	-0.16555000
70	EPMMOP-70-CAL-01-R	Adoquinado Calle Vergel 2, Carapungo	m2	8,720.00	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Calderón	Calderón	Carapungo	Urbano parroquial	\$ 138,313.03	\$ 138,313.03	Ing. Condo Ramirez Segundo Rodrigo	Estudios entregados	21-Sep-11	19-Ene-12	Obra Contratada concluida, la señalización se ejecutará por Administración Directa.	C	GOP	P	-78.44970000	-0.09748460
71	EPMMOP-71-CAL-01-R	Construcción puente peatonal atirantado, acceso Carapungo	m	50.00	Movilidad y Transporte	Circulación peatonal segura	Calderón	Calderón	Carapungo	Urbano parroquial	\$ 361,988.14	\$ 361,988.14	Ing. Olmedo Toledo Diego	Estudios entregados	Por definir		Adjudicado, en elaboración contrato en Asesoría Jurídica.	P	UPEV	M	-78.45383173	-0.10466896
72	EPMMOP-118-DEL-12-U	Construcción del puente peatonal en el Intercambiador Carcelén	m	45.00	Movilidad y Transporte	Circulación peatonal segura	La Delicia	Ponceño	Muñoz Carvajal		\$ 152,974.63	\$ 152,974.63	Ing. Albán Jaramillo Angel Rodrigo		Por definir	Por definir	Adjudicado, en elaboración contrato en Asesoría Jurídica.	P	GOP	M	-78.46870000	-0.09613889
73		Construcción del empedrado y reempedrado en la calle N76. Conjunto El Olivar	m2		Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	La Delicia	Carcelén	Urabá		\$ 31,299.06	\$ 31,299.06	CRV Construcciones		Por definir	Por definir	Adjudicado, en elaboración contrato en Asesoría Jurídica.	P	GOP	P	-78.47904722	-0.09691111
74	EPMMOP-72-CAL-01-R	Asfaltado fajas laterales Av. Carlos Mantilla, San José de Moran	m2	#####	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Calderón	Calderón	San José de Moran	Urbano parroquial	\$ 426,046.62	\$ 426,046.62	T.E.A	Estudios entregados	31-Oct-11	29-Ene-12	En ejecución (50%)	E	GOP	M	-78.44380000	-0.09535290
75	EPMMOP-73-DEL-05-U	Adoquinado Calle A Tramo 1, San Rafael de Cotocollao	m2	2,160.00	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	La Delicia	El Condado	San Rafael de Cotocollao		\$ 71,778.02	\$ 71,778.02	Ing. Bedón Sánchez Edwin Fernando	Estudios entregados	12-Sep-11	11-Nov-11	Obra Contratada concluida, la señalización se ejecutará por Administración Directa.	C	GOP	P	-78.50740000	-0.11511000
76	EPMMOP-74-DEL-05-U	Adoquinado Calle A Tramo 2, San Rafael de Cotocollao	m2	280.00	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	La Delicia	El Condado	San Rafael de Cotocollao		\$ 12,714.97	\$ 12,714.97	DUVALEN Cía. Ltda.	Estudios entregados	21-Sep-11	21-Oct-11	Obra Contratada concluida, la señalización se ejecutará por Administración Directa.	C	GOP	P	-78.50720000	-0.11467300
77	EPMMOP-75-DEL-05-U	Adoquinado Calle C, Santa Rosa de Singuna	m2	780.00	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	La Delicia	El Condado	Santa Rosa de Singuna		\$ 26,738.36	\$ 26,738.36	Arq. Pérez Torres Guido Patricio.	Estudios entregados	08-Sep-11	23-Oct-11	Obra Contratada concluida, la señalización se ejecutará por Administración Directa.	C	GOP	P	-78.51700000	-0.11874900
78	EPMMOP-76-CHI-03-R	Puente vehicular calle El Estadio, La Armenia	m	27.00	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Los Chillos	Conocoto	La Armenia	Urbano parroquial	\$ 58,485.52	\$ 58,485.52	Ing. Vergara Salazar Jorge	Estudios entregados	08-Sep-11	07-Nov-11	Concluida	C	GOP	P	-78.46740000	-0.27224600
79	EPMMOP-77-CHI-03-R	Adoquinado Calle Panzaleo, Conocoto	m2	#####	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Los Chillos	Conocoto	Central	Urbano parroquial	\$ 143,168.32	\$ 143,168.32	Ing. Vergara Salazar Jorge	Estudios entregados	27-Sep-11	28-Ene-12	En ejecución (60%)	E	GOP	P	-78.47290000	-0.32767100
80	EPMMOP-78-QUI-02-U	Adoquinado Calle 1, Barrio 18 de Octubre, Guamaní	m2	4,060.00	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Quitumbe	Guamaní	18 de Octubre		\$ 100,848.58	\$ 100,848.58	Ing. Córdova Jiménez Fabián Eduardo	Estudios entregados	08-Sep-11	22-Nov-11	Obra Contratada concluida, la señalización se ejecutará por Administración Directa.	C	GOP	P	-78.56480000	-0.32778300
81	EPMMOP-79-QUI-03-U	Adoquinado Calle Francisco Becerra, Martha Bucaram	m2	910.00	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Quitumbe	La Ecuatoriana	Martha Bucaram		\$ 25,066.86	\$ 25,066.86	CONSTCOMERGO S. A.	Estudios entregados	08-Sep-11	23-Oct-11	Obra Contratada concluida, la señalización se ejecutará por Administración Directa.	C	GOP	P	-78.56740000	-0.29999800
82	EPMMOP-80-QUI-04-U	Adoquinado Calle 4, Barrio Tambollacta	m2	2,525.00	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Quitumbe	Quitumbe	Tambollacta		\$ 62,398.24	\$ 62,398.24	Arq. Tintín Gómez Daniel	Estudios entregados	09-Sep-11	08-Nov-11	Obra Contratada concluida, la señalización se ejecutará por Administración Directa.	C	GOP	P	-78.54440000	-0.29087200
83	EPMMOP-81-TUM-08-R	Adoquinado Calle El Refugio, Barrio Buena Esperanza	m2	9,600.00	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Tumbaco	Tumbaco	Buena Esperanza	Urbano parroquial	\$ 151,249.53	\$ 151,249.53	Ing. Condo Ramirez Segundo Rodrigo	Estudios entregados	21-Sep-11	19-Ene-12	En ejecución (85%)	E	GOP	M	-78.38090000	-0.20019500
84	EPMMOP-82-TUM-02-R	Adoquinado Calle B y Febres Cordero, Barrio Santa Lucía, Cumbayá	m2	8,800.00	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Tumbaco	Cumbayá	Santa Lucía	Urbano parroquial	\$ 129,612.95	\$ 129,612.95	Ing. López Guambo Diego	Estudios entregados	27-Sep-11	26-Dic-11	Obra Contratada concluida, la señalización se ejecutará por Administración Directa.	C	GOP	P	-78.44620000	-0.19800900



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
ING. GERMANICO PINTO TROYA
GERENTE GENERAL



N.	Código	Nombre del proyecto	Unidad de medida	Cantidad	Tipo de obra	Subtipo de obra	Adm. Zonal responsable	Ubicación Parroquia	Barrio	Ámbito Territorial (Aplica parroquias rurales)	Costo del proyecto	Presupuesto 2011	Contratista	Fecha de entrega de estudios	Inicio de Obra	Fin de Obra	Observaciones	Estado	Reporta	Tamaño	Longitud	Latitud
85	EPMMOP-83-CHI-03-R	Adoquinado Calle Lizardo García Tramo 1, Conocoto Alto	m2	2,369.40	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Los Chillos	Conocoto	Conocoto Alto	Urbano parroquial	\$ 146,862.29	\$ 0.00	Ing. Naranjo Guambo Marco Antonio		01-Oct-10	29-Mar-11	Concluida	C	GOP	M	-78.49639900	-0.25885300
86	EPMMOP-84-CHI-03-R	Arreglo empedrado Calle Benjamín Carrión, Sector La Siria	m2	2,000.00	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Los Chillos	Conocoto	La Siria	Periférico rural	\$ 7,020.00	\$ 7,020.00	Arq. Guerra Dávila Rita Mónica		17-Dic-10	15-Ene-11	Concluida	C	GOP	P	-78.45970000	-0.27348600
87	EPMMOP-85-QUI-01-U	Construcción de bordillos en las calles del programa de vivienda Girón de Chillogallo.	m	1,100.00	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Quitumbe	Chillogallo	El Girón		\$ 58,962.30	\$ 58,962.30	Arq. Sarzosa Riera Vicente Carlos	Estudios entregados	Por definir		El DMQ mediante Resolución 525 y Ordenanza 325, declara el proceso desierto	P	GOP	P	NA	NA
88	EPMMOP-86-TUM-02-R	Asfaltado de las calles Leónidas Proaño y Joaquín Lalama.	m2	7,200.00	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Tumbaco	Cumbayá	San Francisco de Tanda	Urbano parroquial	\$ 166,598.39	\$ 166,598.39	Ing. Naranjo Guambo Marco Antonio	Estudios entregados	Por definir		Se ejecuta un rediseño de la estructura de pavimento con el fin de adaptar el proyecto a la construcción de bordillos ejecutada por la Administración Zonal Eugenio Espejo.	P	GOP	M	-78.4410395	-0.1805559
89	EPMMOP-87-CHI-03-R	Construcción de bordillos, sub-base y transporte de mezcla asfáltica en frío Calle Alexander Von Humboldt, Barrio San Lorenzo, Conocoto	m	1,200.00	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Los Chillos	Conocoto	San Lorenzo	Urbano parroquial	\$ 34,455.10	\$ 34,455.10	Ing. Pallo Chipantasi Edgar Gonzalo	Estudios entregados	20-Oct-11	30-Nov-11	Concluida	C	GOP	P	-78.49855951	-0.31862626
90	EPMMOP-88-EUG-02-U	Aceras Calles Antonio Herrera y José Berrutieta, La Gasca	m2	581.00	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	Eugenio Espejo	Belisario Quevedo	La Gasca		\$ 8,500.78	\$ 8,500.78	Arq. Sarzosa Riera Vicente Carlos		10-Dic-10	07-Feb-11	Concluida	C	GOP	P	-78.51090200	-0.18974700
91	EPMMOP-89-EUG-07-R	Caminerías en Reformas Geométricas Av. 6 de Diciembre entre Av. Gaspar de Villaruel y De los Granados, Jipijapa	m2	454.00	Movilidad y Transporte	Reformas Geométricas Mayores	Eugenio Espejo	Iñaquito	El Batán		\$ 46,082.14	\$ 46,082.14	Ing. Jorge Sandoval		29-Dic-10	28-Feb-11	Concluida	C	GOP	P	-78.47620000	-0.16995900
92	EPMMOP-90-QUI-01-U	Reformas Geométricas, aceras, bordillos y señalización en la intersección Av. Morán Valverde y Mariscal Sucre	m2	958.63	Movilidad y Transporte	Reformas Geométricas Mayores	Quitumbe	Chillogallo	Chillogallo		\$ 55,383.30	\$ 55,383.30	Arq. Chicaiza Ulle Manuel Fernando		20-Ene-11	09-Abr-11	Concluida	C	GOP	P	-78.55270000	-0.27914900
93	EPMMOP-91-QUI-01-U	Reconstrucción tramo Calle Carlos Freile intersección Calle Luis Duque, entre los barrios El Girón y El Tránsito.	m2	200.00	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	Quitumbe	Chillogallo	Varios		\$ 15,394.05	\$ 15,394.05	Arq. Guerra Dávila Rita Mónica		11-Ene-11	11-Abr-11	Concluida	C	GOP	P	-78.56770000	-0.28892400
94	EPMMOP-92-TUM-08-R	Varios Trabajos para la terminación Coliseo de Tumbaco	m2	124.9	Espacio Público	Equipamiento de Servicios	Tumbaco	Tumbaco	Central	Urbano parroquial	\$ 18,410.40	\$ 18,410.40	Arq. Aguilar Játiva Lenin Patricio		28-Dic-10	12-Jun-11	Concluida	C	GOP	P	-78.3921573	-0.215752
95	EPMMOP-93-TUM-02-R	Muro gaviones para estabilizar talud oriental Vía Interoceánica, salida Túnel Guayasamín	m2	52.00	Espacio Público	Construcción de Muro de Contención y Estabilización de Taludes	Tumbaco	Cumbayá	Bolaños	Periférico rural	\$ 13,628.99	\$ 13,628.99	Ing. Andrango Atahualpa Washington Efraín		01-Dic-10	14-Ene-11	Concluida	C	GOP	P	-78.46589700	-0.19375300
96	EPMMOP-94-TUM-02-R	Rehabilitación pavimento Calle Francisco de Orellana, desde redondeo Los Bañistas hasta Calle Francisco de Pineda	km	4.39	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	Tumbaco	Cumbayá	Central	Urbano parroquial	\$ 363,077.42	\$ 363,077.42	Menatlas Quito C. A.		21-Ene-11	21-May-11	Concluida	C	GOP	M	-78.42220000	-0.20606800



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
ING. GERMANICO PINTO TROYA
GERENTE GENERAL



N.	Código	Nombre del proyecto	Unidad de medida	Cantidad	Tipo de obra	Subtipo de obra	Adm. Zonal responsable	Ubicación Parroquia	Barrio	Ámbito Territorial (Aplica parroquias rurales)	Costo del proyecto	Presupuesto 2011	Contratista	Fecha de entrega de estudios	Inicio de Obra	Fin de Obra	Observaciones	Estado	Reporta	Tamaño	Longitud	Latitud
97	EPMMOP-95-DMQ	Provisión e instalación de señalización vertical, panel de mensajes, tachas y bolardos, Vía Interoceánica desde Plaza Argentina hasta la Y de Pifo	km	23.00	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 139,266.50	\$ 139,266.50	INTERBRAZZ Sr. Brazzero Quincha Carlo Aníbal		29-Abr-11	Por definir	Concluida	C	GOP	P	-78.43770000	-0.20329800
98	EPMMOP-96-TUM-02-R	Provisión e instalación de sumideros y tubería, varias calles, barrios Lumbisí y San Francisco de Pinsha	unidad	62	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	Tumbaco	Cumbayá	Varios	Urbano parroquial	\$ 18,961.06	\$ 18,961.06	Ing. Baldeón Mena Carlos Cristóbal		04-Mar-11	01-Jun-11	Concluida	C	GOP	P	NA	NA
99	EPMMOP-97-TUM-08-R	Mantenimiento y reparación puente sobre el Río Chiche, Vía Interoceánica	unidad	1	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	Tumbaco	Tumbaco		Periférico rural	\$ 126,724.77	\$ 126,724.77	Ing. Osejo Castillo Omar Remigio		17-Ene-11	Por definir	Contrato original concluido, en proceso contrato complementario.	P	GOP	P	-78.36910000	-0.21079700
100	EPMMOP-98-SAE-01-U	Adecuaciones en la Parada Marín - Central - Corredor Ecovia, sector La Marín, parroquia Centro Histórico	unidad	1	Movilidad y Transporte	Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial del SIT Metrobús-Q	Manuela Sáenz	Centro Histórico	La Marín		\$ 19,411.77	\$ 19,411.77	QUIMO CONSTRUCCIONES Cía. Ltda.		28-Dic-10	01-Jun-11	Concluida	C	GOP	P	-78.50830000	-0.22215400
101	EPMMOP-99-SAE-02-U	Construcción de aceras y bordillos en el Camino de Orellana, sector Piedra Grande de Guápulo, parroquia Itchimbia	m2	306.98	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	Manuela Sáenz	Itchimbia	Guápulo		\$ 9,234.10	\$ 9,234.10	Ing. Ahtty Vera Wilson Aníbal		03-Ene-11	02-Feb-11	Concluida	C	GOP	P	-78.4773773	-0.1998683
102	EPMMOP-100-DMQ	Reparación de las paradas del Corredor Sur Oriental del Distrito Metropolitano de Quito	unidad	18	Movilidad y Transporte	Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial del SIT Metrobús-Q	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 54,818.23	\$ 43,995.81	Ing. Torres Rosero Héctor Gonzalo		25-Nov-10	25-Ago-11	Concluida	C	GOP	P	-78.52700000	-0.26519600
103	EPMMOP-101-SAE-04-U	Cunetas en el conjunto Habitacional Carolina II, ubicado en la calle Javier Loyola y avenida Simón Bolívar, sector Patrimonio Familiar Puengasí.	m	112.00	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	Manuela Sáenz	Puengasí	Patrimonio Familiar		\$ 10,757.92	\$ 10,757.92	Ing. Freire Álvarez María Graciela		23-Dic-10	21-Ene-11	Concluida	C	GOP	P	-78.49040000	-0.23735700
104	EPMMOP-102-DEL-12-U	Obras Complementarias en el edificio de Boleterías del Terminal de Transporte Interprovincial de Carcelén	unidad	1	Movilidad y Transporte	Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial del SIT Metrobús-Q	La Delicia	Ponceano	Muñoz Carvajal		\$ 55,756.29	\$ 55,756.29	Ing. Buitrón Villacís Jaime Gonzalo		20-Ene-11	08-Jul-11	Concluida	C	GOP-GTI	P	-78.46990000	-0.10002400
105	EPMMOP-103-DEL-12-U	Construcción de pasamanos, cerramientos y garita en la Estación de Transferencia Interprovincial de Carcelén, parroquia Carcelén.	unidad	1	Movilidad y Transporte	Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial del SIT Metrobús-Q	La Delicia	Ponceano	Muñoz Carvajal		\$ 43,393.06	\$ 21,610.90	Ing. Iglesias Palacios Carlos Geovanny		23-Nov-10	23-Jun-11	Concluida	C	GOP-GTI	P	-78.46990000	-0.10002400
106	EPMMOP-104-QUI-02-U	Reparación y reposición de carpeta asfáltica Tramos 1 y 2 calle Camilo Orejuela.	m2	#####	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Quitumbe	Guamáni	Varios		\$ 256,477.91	\$ 256,477.91	Ing. Zambrano Carrera Wilson		23-Jun-11	21-Oct-11	Concluida	C	GOP	M	-78.56680000	-0.32692600
107	EPMMOP-105-QUI-02-U	Adoquinado Tramo 3 calle Camilo Orejuela	m2	#####	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Quitumbe	Guamáni	Varios		\$ 300,339.28	\$ 300,339.28	Ing. Condo Ramirez Segundo Rodrigo		20-Jul-11	17-Nov-11	Obra Contratada concluida, la señalización se ejecutará por Administración Directa.	C	GOP	M	-78.56680000	-0.32692600



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
ING. GERMANICO PINTO TROYA
GERENTE GENERAL



N.	Código	Nombre del proyecto	Unidad de medida	Cantidad	Tipo de obra	Subtipo de obra	Adm. Zonal responsable	Ubicación Parroquia	Barrio	Ámbito Territorial (Aplica parroquias rurales)	Costo del proyecto	Presupuesto 2011	Contratista	Fecha de entrega de estudios	Inicio de Obra	Fin de Obra	Observaciones	Estado	Reporta	Tamaño	Longitud	Latitud
108	EPMMOP-106-CAL-01-R	Ampliación y Reconstrucción Av. Giovanni Calles	km	4.3	Movilidad y Transporte	Acceso a Barrios	Calderón	Calderón	Centro	Urbano parroquial	\$ 1,174,627.49	\$ 1,174,627.49	T.E.A Cía Ltda.	15-Jul-11	15-Ago-11	12-Ene-12	Se reinician parcialmente los trabajos con un avance del 21%; la Administración Zonal continua con los trabajos en aceras, bordillos y retiro de postes.	E	GOP	G	-78.43520000	-0.09315550
109	EPMMOP-107-DMQ	Sello Slurry Seal Av. 6 De Diciembre (Río Coca - Sodiro)	km	7.2	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 651,629.99	\$ 650,000.00	Por definir	16-Mar-11	Por definir		Se ha realizado mantenimiento rutinario, se programará en el cronograma de mantenimiento	P	GOP	G	-78.47670000	-0.17262100
110	EPMMOP-108-EUG-10-U	Redondel Plaza Artigas	unidad	1	Movilidad y Transporte	Reformas Geométricas Mayores	Eugenio Espejo	Mariscal Sucre	La Floresta		\$ 400,000.00		NA		Por definir		Obra a ser considerada en programación futura	P	GOP	M	-78.48290300	-0.20360100
111	EPMMOP-109-ELO-05-U	Redondel Av. Teniente Hugo Ortiz y Alonso de Angulo primera fase	unidad	1	Movilidad y Transporte	Reformas Geométricas Mayores	Eloy Alfaro	La Magdalena	Atahualpa		\$ 50,000.00		NA		Por definir		Obra a ser considerada en programación futura	P	GOP	P	-78.53119700	-0.24945200
112	EPMMOP-110-SAE-02-U	Redondel Plaza Brasilia	unidad	1	Movilidad y Transporte	Reformas Geométricas Mayores	Manuela Sáenz	Itchimbia	La Vicentina		\$ 50,000.00		NA		Por definir		Obra a ser considerada en programación futura	P	GOP	P	-78.48870100	-0.21279400
113	EPMMOP-111-EUG-07-R	Estudio Paso elevado o deprimido intersección Av. Eloy Alfaro y Granados	unidad	1	Movilidad y Transporte	Reformas Geométricas Mayores	Eugenio Espejo	Iñaquito	El Batán		\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	Por definir		Por definir		TDRs para estudios aprobados por el BdE, se procederá con proceso de contratación.	P	GOP	M	-78.46840000	-0.16591900
114	EPMMOP-112-EUG-04-U	Estudio paso deprimido Mariscal Sucre - Legarda	unidad	1	Movilidad y Transporte	Reformas Geométricas Mayores	Eugenio Espejo	Cochabamba	Bellavista Alta		\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	Por definir		Por definir		Se redefine y pasa de intercambiador a reforma geométrica, los estudios se realizarán por administración directa.	P	GOP	P	-78.50660000	-0.11941500
115	EPMMOP-113-DEL-05-U	Estudio paso deprimido Mariscal Sucre - Rumihurco/Condado	unidad	1	Movilidad y Transporte	Reformas Geométricas Mayores	La Delicia	El Condado	San José del Condado		\$ 42,486.00	\$ 42,486.00	Por definir		Por definir		Proceso en el Portal	P	GOP	P	-78.49770000	-0.10538400
116	EPMMOP-114-DMQ	Estudios de Suelos para Muros	unidad	N/A	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 30,000.00		Adm. Directa		Por definir		Estudios por Administración Directa	E	GOP	P	NA	NA
117	EPMMOP-115-ELO-05-U	Intersección Av. Lauro Guerrero y calle Jumandi.	unidad	1	Movilidad y Transporte	Reformas Geométricas Menores	Eloy Alfaro	La Magdalena	Atahualpa		\$ 46,128.59	\$ 46,128.59	Jurado Jurado Constructores	Estudios entregados	Por definir		Se suspende la ejecución hasta Enero 2012, ya que se quiere evitar congestionamiento vial que producirá la obra.	S	GOP	P	-78.52530208	-0.25035439
118	EPMMOP-116-EUG-06-U	Intersección Av. Del Maestro y calle Tyarco.	unidad	1	Movilidad y Transporte	Reformas Geométricas Menores	Eugenio Espejo	Concepción	Rumiñahui		\$ 32,209.05	\$ 32,209.05	Arq. Silva Solórzano Julia	Estudios entregados	25-Nov-11	24-Ene-12	En ejecución (25%)	E	GOP	P	-78.49009056	-0.12303408
119	EPMMOP-117-DEL-02-U	Intersección Av. Jaime Roldós e Isidro Ayora.	unidad	1	Movilidad y Transporte	Reformas Geométricas Menores	La Delicia	Carcelén	Carcelén		\$ 43,748.39	\$ 43,748.39	Arq. Guerra Dávila Rita Mónica	Estudios entregados	Por definir		Se ha determinado la necesidad de reformar el proyecto inicial, se encuentra en proceso de redefinición.	P	GOP	P	-78.46684403	-0.08331097
120	EPMMOP-119-EUG-10-U	Repavimentación Francisco de Orellana	km	4.24	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	Eugenio Espejo	Mariscal Sucre e Iñaquito	Varios		\$ 350,000.00	\$ 98,500.81	OBRACIV Cía. Ltda. (Ing. Luis Burbano Enriquez)		19-Ene-11	18-Jul-11	Concluida	C	GOP	M	-78.48820000	-0.19763000
121	EPMMOP-120-DMQ	Rehabilitación Av. Pérez Guerrero	m2	N/A	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 148,737.83	\$ 0.00	NA	04-Feb-11			A cargo del Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP)	P		M	-78.50040000	-0.20448800
122	EPMMOP-121-DMQ	Rehabilitación Av. América	km	5.30	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 430,000.00	\$ 430,000.00	MODELCO	17-Feb-11	07-Sep-11	20-Ene-12	En ejecución (74%)	E	GOP	M	-78.49570000	-0.18743100
123	EPMMOP-122-DMQ	Repavimentación Av. De La Prensa	km	2.62	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	Eugenio Espejo	Concepción	Varios		\$ 1,260,000.00	\$ 1,260,000.00	Ing. Rubén Lozada	28-Mar-11	16-Sep-11	14-Ene-12	En ejecución (86%)	E	GOP	G	-78.49380000	-0.13392400
124	EPMMOP-123-DMQ	Rehabilitación Av. González Suárez	m2	2,520.00	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 44,656.35	\$ 44,656.35	Por definir	28-Feb-11	21-Nov-11	29-Dic-11	Concluida	C	GOP	P	-78.47600000	-0.19367000



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
ING. GERMANICO PINTO TROYA
GERENTE GENERAL



N.	Código	Nombre del proyecto	Unidad de medida	Cantidad	Tipo de obra	Subtipo de obra	Adm. Zonal responsable	Ubicación Parroquia	Barrio	Ámbito Territorial (Aplica parroquias rurales)	Costo del proyecto	Presupuesto 2011	Contratista	Fecha de entrega de estudios	Inicio de Obra	Fin de Obra	Observaciones	Estado	Reporta	Tamaño	Longitud	Latitud
125	EPMMOP-124-DMQ	Rehabilitación Panamericana Sur	m2	Por definir	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 710,178.82	\$ 0.00	Por definir	28-Feb-11	Por definir		Obra a ser considerada en programación futura	P	GOP	G	-78.55130000	-0.36899100
126	EPMMOP-125-SAE-01-U	Muro Predio Municipal, Escalinata S/N y Melchor Aymerich, El Panecillo	m2	260.00	Espacio Público	Construcción de Muro de Contención y Estabilización de Taludes	Manuela Sáenz	Centro Histórico	Panecillo		\$ 11,728.69	\$ 11,728.69	Arq. Pinto Sandoval Edgar	Estudios entregados	08-Dic-10	07-Mar-11	Concluida	C	GOP	P	-78.52100000	-0.22617600
127	EPMMOP-126-ELO-06-R	Muro Calle Punta Arenas y Boliche, Barrio Biloxi	m2	355.00	Espacio Público	Construcción de Muro de Contención y Estabilización de Taludes	Eloy Alfaro	La Mena	Biloxi		\$ 26,398.60	\$ 10,200.14	Arq. Irigoyen Jurado Héctor Hugo	Estudios entregados	25-Nov-10	22-Feb-11	Concluida	C	GOP	P	-78.54380000	-0.25295000
128	EPMMOP-127-SAE-04-U	Muro acceso al Barrio Madrigal, Monjas	m2	734.00	Espacio Público	Construcción de Muro de Contención y Estabilización de Taludes	Manuela Sáenz	Puengasí	Madrigal		\$ 35,326.77	\$ 35,326.77	Ing. Osejo Castillo Omar Remigio	Estudios entregados	25-Nov-10	23-Ene-11	Concluida	C	GOP	P	-78.48680000	-0.22876500
129	EPMMOP-128-DEL-03-U	Muro Calle Fortines, Comité del Pueblo	m2	42.00	Espacio Público	Construcción de Muro de Contención y Estabilización de Taludes	La Delicia	Comité del Pueblo	Comité del Pueblo		\$ 27,368.85	\$ 27,368.85	PRISMARQ ARQUITECTOS (Arq. Víctor Bungacho Lamar)	Estudios entregados	04-Mar-11	01-Jun-11	Concluida	C	GOP	P	-78.46310000	-0.11629600
130	EPMMOP-129-QUI-01-U	Muro Protección Área Deportiva Complejo Habitacional Casa Suya	m2	153.00	Espacio Público	Construcción de Muro de Contención y Estabilización de Taludes	Quitumbe	Chillogallo	Casa Suya		\$ 17,843.17	\$ 17,843.17	Ing. Arturo Burbano Franklin Bladimir	26-Mar-10	21-Ene-11	21-Abr-11	Concluida	C	GOP	P	-78.57483245	-0.28883698
131	EPMMOP-130-SAE-01-U	Muro de hormigón ciclópeo en el Colegio Jesús de Nazareth, La Recoleta.	m2	360.00	Espacio Público	Construcción de Muro de Contención y Estabilización de Taludes	Manuela Sáenz	Centro Histórico	La Recoleta		\$ 14,822.69	\$ 14,822.69	Ing. Piedra Constante Telmo Gonzalo	Estudios entregados	25-Nov-11	09-Ene-12	En ejecución (52%)	E	GOP	P	-78.51134923	-0.23062983
132	EPMMOP-131-EUG-02-U	Muro de hormigón armado en la calle Padre Damián. La Primavera.	m2	57.00	Espacio Público	Construcción de Muro de Contención y Estabilización de Taludes	Eugenio Espejo	Belisario Quevedo	La Primavera		\$ 23,388.15	\$ 23,388.15	Ing. Sánchez Pérez Héctor Homero	Estudios entregados	02-Dic-11	16-Ene-12	En ejecución (35%)	E	GOP	P	-78.51029797	-0.18257126
133	EPMMOP-132-EUG-02-U	Muro de revestimiento en la calle Padre Damián y calle N32 y Oe11, La Primavera.	m2	410.00	Espacio Público	Construcción de Muro de Contención y Estabilización de Taludes	Eugenio Espejo	Belisario Quevedo	La Primavera		\$ 18,133.96	\$ 18,133.96	Ing. Aguaguña Quiroz Luis Enrique	Estudios entregados	Por definir		Contrato devuelto a la Coordinación de Contratación Pública por existir errores	P	GOP	P	-78.51029797	-0.18257126
134	EPMMOP-133-ELO-04-U	Estabilización taludes en la Av. Simón Bolívar. Sector Forestal.	m2	#####	Espacio Público	Construcción de Muro de Contención y Estabilización de Taludes	Eloy Alfaro	La Ferroviaria	Forestal Alta		\$ 636,478.00	\$ 636,478.00	Ing. Torres Homero	Estudios entregados	04-Oct-11	20-Ene-12	En ejecución (38%)	E	GOP	M	-78.50396667	0.26088333
135	EPMMOP-134-DMQ	Señalización corredores principales	km	34.00	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 300,000.00	\$ 550,000.00	Adm. Directa				Actividad permanente	E	GOP	M	NA	NA
136	EPMMOP-135-DMQ	Señalización calles	km		Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 700,000.00		Adm. Directa					Actividad permanente	E	GOP	G	NA
137	EPMMOP-136-Varias	Estudios y proyecto de ampliación de la zona azul. Sector Norte	unidad	1	Movilidad y Transporte	Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial del SIT Metrobús-Q	Eugenio Espejo	Varias	Varias		\$ 49,363.00	\$ 0.00	NA	Estudios entregados	Ago-10	31-Ene-11	En operación las zonas 2 y 3.	C	GTE	P	NA	NA
138	EPMMOP-137-Varias	Plan de Operación y comunicación. Sector Norte Zona Azul	unidad	1	Movilidad y Transporte	Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial del SIT Metrobús-Q	Eugenio Espejo	Varias	Varias		\$ 16,843.00	\$ 0.00	NA	Estudios entregados	Ago-10	01-Feb-11	Plan de comunicación para la etapa 2 (Sta. Clara y Mariscal 2) en desarrollo en coordinación con la Unidad de Comunicación de la EPMMOP y la Secretaría de Comunicación del Municipio.	C	GTE	P	NA	NA



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
ING. GERMANICO PINTO TROYA
GERENTE GENERAL



N.	Código	Nombre del proyecto	Unidad de medida	Cantidad	Tipo de obra	Subtipo de obra	Adm. Zonal responsable	Ubicación Parroquia	Barrio	Ámbito Territorial (Aplica parroquias rurales)	Costo del proyecto	Presupuesto 2011	Contratista	Fecha de entrega de estudios	Inicio de Obra	Fin de Obra	Observaciones	Estado	Reporta	Tamaño	Longitud	Latitud	
139	EPMMOP-138-Varias	Implementación. Señalización y equipamiento. Sector Norte Zona Azul	unidad	1	Movilidad y Transporte	Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial del SIT Metrobús-Q	Eugenio Espejo	Varias	Varias		\$ 104,108.00	\$ 0.00	NA	Estudios entregados	Ago-10	31-Ene-11	Proyecto incluye inversiones para equipamiento, señalización vertical y horizontal, apoyo logístico de la Policía Metropolitana.	C	GTE	P	NA	NA	
140	EPMMOP-139-DMQ	Reorganización de rutas de transporte público (estudio e implementación)	unidad	1	Movilidad y Transporte	Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial del SIT Metrobús-Q	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	Adm. Directa	Por definir	01-Ago-11	31-Dic-11	A partir del Sábado 3 de diciembre de 2011, se recortaron las rutas San Vicente-Marín (CATAR), Condado-Marín (PAQUISHA) y San Carlos-Marín (San Carlos), hasta el sector del Ejido, y se implementaron los servicios de alimentación al Corredor Ecovia: Llano Chico-Río Coca, Carapungo-Av. Eloy Alfaro-Río Coca y Carapungo-Av. Simón Bolívar-Río Coca, cumpliéndose el objetivo de la fase 1, retiro de 141 buses a La Marín.	E	GGM	M	NA	NA	
141	EPMMOP-140-DMQ	Proyecto de Legalización de Taxis	unidad	6,000	Movilidad y Transporte	Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial del SIT Metrobús-Q	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	Adm. Directa	NA	01-Jun-11	09-Mar-12	En ejecución la etapa de "Informe motivado"; además se están resolviendo las peticiones a los recursos de revisión.	E	GG	M	NA	NA	
142	EPMMOP-141-DMQ	Proyecto Regulación del Servicio de Carga Liviana en las Parroquias Rurales del DMQ.	unidad	1	Movilidad y Transporte	Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial del SIT Metrobús-Q	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	Adm. Directa	Estudios entregados	Por definir			En espera decisión del Concejo Metropolitano	P	GGM	P	NA	NA
143	EPMMOP-142-DMQ	Proyecto Racionalización de transporte escolar	unidad	1	Movilidad y Transporte	Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial del SIT Metrobús-Q	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	Adm. Directa	NA	Por definir			Se llevó a cabo una reunión con el Señor Secretario de Movilidad, para redireccionar este proyecto y se lo enmarque dentro de un censo, en coordinación con el Ministerio de Educación y los representantes de esta modalidad de transporte, a partir del mes de Enero de 2012.	P	GGM	P	NA	NA
144	EPMMOP-143-DMQ	Desarrollo de nuevo software para gestión administrativa de flota	unidad	1	Movilidad y Transporte	Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial del SIT Metrobús-Q	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	OMNISOFT		01-Jun-10	Por definir	En proceso la terminación unilateral del Contrato con Omnisoft.	S	GGM	P	NA	NA	
145	EPMMOP-144-DMQ	Módulos de paradas en corredores de transporte convencional	unidad	1,000	Movilidad y Transporte	Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial del SIT Metrobús-Q	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 1,900,000.00	\$ 1,900,000.00	Por definir	Por definir	Por definir			En espera toma de decisiones.	P	GGM	G	NA	NA



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
ING. GERMANICO PINTO TROYA
GERENTE GENERAL



N.	Código	Nombre del proyecto	Unidad de medida	Cantidad	Tipo de obra	Subtipo de obra	Adm. Zonal responsable	Ubicación Parroquia	Barrio	Ámbito Territorial (Aplica parroquias rurales)	Costo del proyecto	Presupuesto 2011	Contratista	Fecha de entrega de estudios	Inicio de Obra	Fin de Obra	Observaciones	Estado	Reporta	Tamaño	Longitud	Latitud
146	EPMMOP-145-DMQ	Sistema de monitoreo en línea del transporte público en buses y vehículos de carga liviana del DMQ	unidad	1	Movilidad y Transporte	Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial del SIT Metrobús-Q	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	Adm. Directa	NA	Actividad permanente	Actividad permanente	Está contemplado el mejoramiento aplicativo de Gestión de Flotas a su segunda fase. - Se verifican 5 rutas diarias - Se analiza reportes operacionales para socialización con operadores - Se realizará la contratación de un profesional para desarrollar aplicaciones de PUNTO NET. - En proceso de contratación dispositivo de almacenamiento back up y Sistema de Control de Incendios para el Centro de Gestión de Flotas.	E	GGM	P	NA	NA
147	EPMMOP-146-DMQ	Construcción Centro Comando de Movilidad	m2	Por definir	Movilidad y Transporte	Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial del SIT Metrobús-Q	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	Por definir	Por definir	Por definir		Por definirse la concepción general del proyecto incluido la ubicación.	P	GG	G	NA	NA
148	EPMMOP-147-DMQ	Operación y Mantenimiento del Sistema de Semaforización Actual	unidad	428	Movilidad y Transporte	Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial del SIT Metrobús-Q	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 520,000.00	\$ 520,000.00	Varios	NA	Actividad permanente	Actividad permanente	Para el proceso de adquisición de elementos semafóricos por (\$139.050), se realizó el informe de la subcomisión de apoyo y se ha realizado la negociación económica de la oferta habilitada y adjudicada con Empresa Electrónica GOIA. Esta en proceso de elaboración del contrato.	E	GGM	M	NA	NA
149	EPMMOP-148-DMQ	Adquisición de elementos semafóricos, reguladores de tráfico, etc.	unidad	Por definir	Movilidad y Transporte	Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial del SIT Metrobús-Q	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	Por definir	NA	Por definir		La incorporación de nuevas intersecciones y su análisis de ingeniería de tráfico se estudiará con el nuevo sistema semafórico.	S	GGM	M	NA	NA
150	EPMMOP-149-DMQ	Determinación de planes operacionales para los corredores en ejecución	unidad	1	Movilidad y Transporte	Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial del SIT Metrobús-Q	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	Por definir	NA	Por definir		En proceso de adquisición licencias para el software de modelación rutas TransCAD Full y TransModeler.	P	GGM	M	NA	NA
151	EPMMOP-150-DMQ	Estudio de demanda del Sistema de Corredores Metrobús-Q	unidad	1	Movilidad y Transporte	Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial del SIT Metrobús-Q	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	Por definir	Por definir	Por definir		No se autorizó la contratación de Estudios de Demanda, la Gerencia de Gestión de la Movilidad tomará como base para todas sus necesidades la información que proporcione el estudio de demanda que contrató la Unidad Metro Quito para todo el DMQ.	P	GGM	M	NA	NA
152	EPMMOP-151-DMQ	Mejoramiento de la infraestructura en paradas del corredor central norte	unidad	Por definir	Movilidad y Transporte	Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial del SIT Metrobús-Q	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 668,703.00	\$ 668,703.00	EPMTPQ (Trolebús)	15-Abr-11	15-Jun-11	30-Sep-11	A cargo de la EPMTPQ	P		G	NA	NA



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
ING. GERMANICO PINTO TROYA
GERENTE GENERAL



N.	Código	Nombre del proyecto	Unidad de medida	Cantidad	Tipo de obra	Subtipo de obra	Adm. Zonal responsable	Ubicación Parroquia	Barrio	Ámbito Territorial (Aplica parroquias rurales)	Costo del proyecto	Presupuesto 2011	Contratista	Fecha de entrega de estudios	Inicio de Obra	Fin de Obra	Observaciones	Estado	Reporta	Tamaño	Longitud	Latitud
153	EPMMOP-152-DMQ	Modernización y optimización del sistema de semaforización y sistema de monitoreo en línea de accesos y vías principales del DMQ	unidad	180	Movilidad y Transporte	Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial del SIT Metrobús-Q	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 27,626,758.09	Por definir	TELVENT TRAFICO Y TRANSPORTE S. A.		24-Nov-11	22-Nov-15	Se ha realizado el pago del anticipo, se coordina con la empresa contratista TELVEN para inicio de los trabajos.	P	GGM	G	NA	NA
154	EPMMOP-153-DMQ	Implementación Tecnología del SIR y SAE	unidad	1	Movilidad y Transporte	Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial del SIT Metrobús-Q	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	NA		NA		A cargo de la Secretaria de Movilidad	P		G	NA	NA
155	EPMMOP-154-QUI-04-U	Construcción de cubierta del andén urbano Trole - Ecovía del Terminal de Transporte Quitumbe.	m2	578.34	Movilidad y Transporte	Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial del SIT Metrobús-Q	Quitumbe	Quitumbe	Quitumbe		\$ 162,131.02	\$ 162,131.02	Ing. Veloz Ingavélez Mauricio Rafael	Estudios entregados	18-Feb-11	18-Nov-11	Concluida	C	GOP	M	-78.55600000	-0.29562900
156	EPMMOP-155-QUI-04-U	Construcción de cubierta del andén urbano Trole - Metrobús del Terminal de Transporte Quitumbe	m2	578.34	Movilidad y Transporte	Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial del SIT Metrobús-Q	Quitumbe	Quitumbe	Quitumbe		\$ 162,131.02	\$ 162,131.02	Ing. Veloz Ingavélez Mauricio Rafael	Estudios entregados	18-Feb-11	18-Nov-11	Concluida	C	GOP	M	-78.55600000	-0.29562900
157	EPMMOP-156-QUI-04-U	Reestructuración del espacio comercial del Terminal Terrestre Quitumbe según estudio de consultoría externa.	m2	3,362.00	Movilidad y Transporte	Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial del SIT Metrobús-Q	Quitumbe	Quitumbe	Quitumbe		\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	Por definir		10-May-11	31-Dic-11	Arrancó proceso de ejecución, se entregó cronograma del proyecto a comerciantes y se inicia la planificación operacional, el modelo de negocio e identidad comercial.	E	GTE	M	-78.55600000	-0.29562900
158	EPMMOP-157-QUI-04-U	Obras de terminación de varios servicios en Terminal Quitumbe	unidad	Por definir	Movilidad y Transporte	Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial del SIT Metrobús-Q	Quitumbe	Quitumbe	Quitumbe		\$ 2,000,000.00	\$ 0.00	Por definir	31-Ene-11	Por definir		El acta de entrega del EPMDUQ del Terminal fue firmada y entregada, se planifica listado y orden prioritario de obras para el POA 2012.	P	GTE	G	-78.55600000	-0.29562900
159	EPMMOP-158-QUI-02-U	Terminal de Guamaní- Rotura de sellos	unidad	N/A	Movilidad y Transporte	Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial del SIT Metrobús-Q	Quitumbe	Guamaní			\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	Adm. Directa	31-Ene-11	Abr-11	May-11	Rotura de sellos (actividad permanente), se concluyó instalación de la caseta	C	GTE	P	-78.55600000	-0.29562900
160	EPMMOP-159-CAL-01-R	Terminal de Calderón - Rotura de sellos	unidad	N/A	Movilidad y Transporte	Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial del SIT Metrobús-Q	Calderón	Calderón	Periférico rural		\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	Adm. Directa	28-Mar-11	Abr-11	May-11	Rotura de sellos (actividad permanente), se concluyó instalación de la caseta	C	GTE	P	-78.46980000	-0.10002500
161	EPMMOP-160-DMQ	Modelo conceptual del SITM y Estudio de Demanda de la 1a. Línea del Metro	unidad	10	Movilidad y Transporte	Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial del SIT Metrobús-Q	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 1,230,415.88	\$ 1,230,415.88	Metro de Madrid S.A.: - Suc. Ecuador	28-Mar-11	NA	NA	Estudios terminados y recibidos	C	UMQ	G	NA	NA
162	EPMMOP-161-DMQ	Estudio de demanda del DMQ y Modelos de Integración	unidad	1	Movilidad y Transporte	Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial del SIT Metrobús-Q	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 3,172,674.68	\$ 3,172,674.68	Metro de Madrid S.A.: - Suc. Ecuador	31-Oct-11	NA	NA	Estudios terminados y recibidos	C	UMQ	G	NA	NA
163	EPMMOP-162-DMQ	Estudio de Factibilidad de la primera línea del Metro	unidad	6	Movilidad y Transporte	Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial del SIT Metrobús-Q	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 2,716,691.00	\$ 2,716,691.00	Metro de Madrid S.A.: - Suc. Ecuador	31-Ene-11	NA	NA	Estudios terminados y recibidos	C	UMQ	G	NA	NA



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
ING. GERMANICO PINTO TROYA
GERENTE GENERAL



N.	Código	Nombre del proyecto	Unidad de medida	Cantidad	Tipo de obra	Subtipo de obra	Adm. Zonal responsable	Ubicación Parroquia	Barrio	Ámbito Territorial (Aplica parroquias rurales)	Costo del proyecto	Presupuesto 2011	Contratista	Fecha de entrega de estudios	Inicio de Obra	Fin de Obra	Observaciones	Estado	Reporta	Tamaño	Longitud	Latitud
164	EPMMOP-163-DMQ	Estudio de Estructuración del financiamiento del proyecto	unidad	1	Movilidad y Transporte	Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial del SIT Metrobús-Q	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 485,294.00	\$ 485,294.00	Metro de Madrid S.A: - Suc. Ecuador	30-Jun-11	NA	NA	Estudios terminados y recibidos	C	UMQ	M	NA	NA
165	EPMMOP-164-DMQ	Estudios Técnicos de Soporte	unidad	4	Movilidad y Transporte	Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial del SIT Metrobús-Q	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	Varios	30-Nov-11	NA	NA	En ejecución contrato complementario de Topografía	E	UMQ	M	NA	NA
166	EPMMOP-165-DMQ	Diseños de ingeniería de la primera línea del metro	unidad	12	Movilidad y Transporte	Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial del SIT Metrobús-Q	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 21,410,000.00	\$ 8,300,000.00	Varios	Ago-12	NA	NA	En ejecución estudio de Impacto en el Desarrollo Urbano. En ejecución Estudio de Impacto Ambiental Proceso Estudio Arqueológico, Paleontológico y Patrimonial, declarado desierto. En ejecución contrato de estudios MDL En ejecución Diseños de Ingeniería de la Primera Línea del Metro.	E	UMQ	G	NA	NA
167	EPMMOP-166-DMQ	Estudios de Base del Proyecto Metro de Quito	unidad	4	Movilidad y Transporte	Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial del SIT Metrobús-Q	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	Varios	Mar-12	NA	NA	En ejecución los estudios de Geología y Geotecnia de Detalle y estudios de Edificaciones, Estructuras y Servicios Afectados. Terminado estudio de Sísmica Pasiva y Vibraciones. En ejecución estudios de Hidrogeología e Hidrología	E	UMQ	G	NA	NA
168	EPMMOP-167-DMQ	Rehabilitación del pavimento de la Av. Simón Bolívar (Tramo 3 intercambiador Morán-Valverde hasta intercambiador autopista General Rumiñahui)	km	13.50	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 15,279,285.25	\$ 14,280,000.00	Construcciones y Servicios de Minería CONSERMIN.	04-Nov-10	06-Jun-11	16-Abr-12	En ejecución (63%)	E	GOP	G	-78.50780000	-0.26970000
169	EPMMOP-168-DMQ	Pavimentación de la vía del trolebús con pavimento rígido, desde la intersección con la calle Santa Prisca hasta la Estación Norte del trolebús.	km	6.44	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 2,964,842.29	\$ 2,964,842.29	Bueno & Castro Cía. Ltda. (Ing. Ramón Castro)	Estudios entregados	24-Ene-11	24-Ago-11	Concluida	C	GOP	G	-78.49250000	-0.18949400
170	EPMMOP-169-DMQ	Mantenimiento con mortero asfáltico (Slurry Seal) Vía Interoceánica desde Tumbaco hasta Pifo.	km	9.28	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 361,235.12	\$ 361,235.12	Consorcio MODELCO-PCV (Ing. Tito Gabriel Moreno Abarca)	Estudios entregados	16-Mar-11	14-Jul-11	Concluida	C	GOP	M	-78.43767670	-0.20329760
171	EPMMOP-170-QUI-04-U	Construcción Paso Elevado Av. Maldonado-Cóndor Nan, sector El Capulí	unidad	1	Movilidad y Transporte	Reformas Geométricas Mayores	Quitumbe	Quitumbe	El Capulí		\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	Por definir	31-Ene-11	Por definir		GOP recibió oficio justificativo de cambio del paso elevado de la Córdor Nan a la Moran Valverde, proyecto paso al plan de obras 2012.	S	GOP	G	-78.54230000	-0.29981100
172	EPMMOP-171-DEL-12-U	Puente de salida del Terminal Terrestre Carcelén	unidad	1	Movilidad y Transporte	Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial del SIT Metrobús-Q	La Delicia	Ponceano	Muñoz Carvajal		\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	Por definir	Por definir	Por definir		Proyecto consta en el plan de obras 2012.	P	GOP	M	-78.46980000	-0.10002500



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
ING. GERMANICO PINTO TROYA
GERENTE GENERAL



N.	Código	Nombre del proyecto	Unidad de medida	Cantidad	Tipo de obra	Subtipo de obra	Adm. Zonal responsable	Ubicación Parroquia	Barrio	Ámbito Territorial (Aplica parroquias rurales)	Costo del proyecto	Presupuesto 2011	Contratista	Fecha de entrega de estudios	Inicio de Obra	Fin de Obra	Observaciones	Estado	Reporta	Tamaño	Longitud	Latitud
173	EPMMOP-172-DEL-12-U	Nuevo módulo boletería fase II, Terminal Carcelén	unidad	1	Movilidad y Transporte	Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial del SIT Metrobús-Q	La Delicia	Ponceano	Muñoz Carvajal		\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	Por definir	Por definir	Por definir		Estudios concluidos, por definir la ejecución del proyecto, paso al POA 2012.	P	GOP	P	-78.46990000	-0.10002400
174	EPMMOP-173-DEL-05-U	Construcción Intersección Plaza de Los Adolescentes	unidad	1	Movilidad y Transporte	Reformas Geométricas Mayores	La Delicia	El Condado	Los Cipreses		\$ 5,641,168.64	\$ 5,641,168.64	Por definir		Por definir		Proceso en el Portal	P	GOP	G	-78.49100000	-0.10191100
175	EPMMOP-174-DMQ	Rehabilitación Simón Bolívar Tramo 1 (Vía Interoceánica - Redondel Navón)	km	5.40	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 5,823,846.50	\$ 5,823,846.50	Por definir		Por definir		Proceso en el Portal	P	GOP	G	-78.46100000	-0.19227300
176	EPMMOP-175-DMQ	Rehabilitación Simón Bolívar tramo 2 (Vía Interoceánica - Autopista Rumiñahui)	km	10.6	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 12,056,466.41	\$ 12,056,466.41	Construcciones y Servicios de Minería CONSERMIN.		14-Nov-11	10-Ago-12	En ejecución (9%)	E	GOP	G	-78.46560000	-0.21657000
177	EPMMOP-176-EUG-04-U	Construcción Intercambiadores Av. Mariscal Sucre Norte: Viaducto calles Jorge Piedra - Manuel Valdivieso.	unidad	1	Movilidad y Transporte	Reformas Geométricas Mayores	Eugenio Espejo	Cochabamba	Andalucía		\$ 11,368,000.00	\$ 11,368,000.00	Por definir		Por definir		Proyectos en revisión.	P	GOP	G	-78.49890000	-0.14709600
178	EPMMOP-177-EUG-04-U	Construcción Intercambiadores Av. Mariscal Sucre Norte: Intercambiador Fernández Salvador	unidad	1	Movilidad y Transporte	Reformas Geométricas Mayores	Eugenio Espejo	Cochabamba	San Carlos		\$ 1,160,000.00	\$ 1,160,000.00	Por definir		Por definir		Enviado al BdE.	P	GOP	G	-78.49890000	-0.14709600
179	EPMMOP-178-DMQ	Rehabilitación Av. Mariscal Sucre Norte (Miraflores - Carcelén)	km	16.80	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 3,871,400.99	\$ 3,871,400.99	Por definir		Por definir		Proceso en el Portal	P	GOP	G	-78.50780000	-0.26970000
180	EPMMOP-179-ELO-06-R	Construcción Intercambiadores Av. Mariscal Sucre Sur: Intercambiador La Mena	unidad	1	Movilidad y Transporte	Reformas Geométricas Mayores	Eloy Alfaro	La Mena	Biloxi		\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	Por definir		Por definir		Estudios concluidos, en espera decisión para construcción	P	GOP	G	-78.49250000	-0.18949400
181	EPMMOP-180-ELO-06-R	Rehabilitación y Mantenimiento Calle Tabiazo	km	1.60	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	Eloy Alfaro	La Mena	Santa Bárbara		\$ 104,260.10	\$ 104,260.10	Ing. Soria Bohórquez Napoleón		02-Feb-11	17-May-11	Concluida	C	GOP	P	-78.55480000	-0.26804800
182	EPMMOP-181-QUI-04-U	Mantenimiento y Estructura Calle Rumichaca	km	2.00	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	Quitumbe	Quitumbe	Las Cuadras		\$ 281,205.73	\$ 281,205.73	Ing. Soria Bohórquez Napoleón		13-Feb-11	21-Jun-11	Concluida	C	GOP	M	-78.55010000	-0.28897400
183	EPMMOP-182-EUG-04-U	Recapeo, señalización horizontal, señalización preventiva de trabajo Calle Legarda	km	1.00	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	Eugenio Espejo	Cochabamba	Bellavista Alta		\$ 123,400.24	\$ 123,400.24	COANDES Cía. Ltda. (Ing. Jaime Durán Abad)		22-Feb-11	15-Jul-11	Concluida	C	GOP	P	-78.50860000	-0.12029100
184	EPMMOP-183-EUG-10-U	Rehabilitación y Mantenimiento Av. Isabel La Católica	km	1.50	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	Eugenio Espejo	Mariscal Sucre	La Floresta		\$ 151,912.44	\$ 151,912.44	Ing. Ocampo Andrade Leopoldo		22-Feb-11	30-Jun-11	Concluida	C	GOP	M	-78.48470000	-0.20584000
185	EPMMOP-184-SAE-02-U	Repavimentación Calle Queseras del Medio	km	0.80	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	Manuela Sáenz	Itchimbia	El Dorado		\$ 85,980.83	\$ 85,980.83	Ing. Ocampo Andrade Leopoldo		22-Feb-11	16-Abr-11	Concluida	C	GOP	P	-78.49220000	-0.21292300
186	EPMMOP-185-EUG-02-U	Repavimentación - Mantenimiento Calle Marchena	km	0.50	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	Eugenio Espejo	Belisario Quevedo	Santa Clara de San Millán		\$ 51,885.18	\$ 51,885.18	Ing. Arroyo Iván		28-Feb-11	21-Jun-11	Concluida	C	GOP	P	-78.49880000	-0.19971000
187	EPMMOP-186-EUG-10-U	Mantenimiento Calle Veintimilla	km	1.50	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	Eugenio Espejo	Mariscal Sucre	Mariscal Sucre		\$ 58,036.70	\$ 58,036.70	OBRACIV Cía. Ltda. (Ing. Luis Burbano Enriquez)		14-Mar-11	30-May-11	Concluida	C	GOP	P	-78.49310000	-0.20379400
188	EPMMOP-187-Varias	Mantenimiento Av. Orellana	km	2.00	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	Eugenio Espejo	Varias	Varias		\$ 98,500.81	\$ 98,500.81	OBRACIV Cía. Ltda. (Ing. Luis Burbano Enriquez)		14-Mar-11	04-Jul-11	Concluida	C	GOP	P	-78.48820000	-0.19763000
189	EPMMOP-188-Varias	Repavimentación - Mantenimiento Av. Eloy Alfaro	km	2.40	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	Eugenio Espejo	Varias	Varias		\$ 402,572.58	\$ 402,572.58	OBRACIV Cía. Ltda. (Ing. Luis Burbano Enriquez)		31-Ene-11	08-Jul-11	Concluida	C	GOP	M	-78.47030000	-0.17066000



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
ING. GERMANICO PINTO TROYA
GERENTE GENERAL



N.	Código	Nombre del proyecto	Unidad de medida	Cantidad	Tipo de obra	Subtipo de obra	Adm. Zonal responsable	Ubicación Parroquia	Barrio	Ámbito Territorial (Aplica parroquias rurales)	Costo del proyecto	Presupuesto 2011	Contratista	Fecha de entrega de estudios	Inicio de Obra	Fin de Obra	Observaciones	Estado	Reporta	Tamaño	Longitud	Latitud
190	EPMMOP-189-Varias	Mantenimiento Av. Teniente Hugo Ortiz	km	2.00	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	Eloy Alfaro	Varias	Varias		\$ 421,606.32	\$ 421,606.32	COANDES Cía. Ltda. (Ing. Jaime Durán Abad)		22-Feb-11	08-Jul-11	Concluida	C	GOP	M	-78.54340000	-0.28217500
191	EPMMOP-190-ELO-09-U	Repavimentación - Mantenimiento Av. Morán Valverde	km	2.00	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	Eloy Alfaro	Solanda	Solanda		\$ 104,352.45	\$ 104,352.45	COANDES Cía. Ltda. (Ing. Jaime Durán Abad)		28-Mar-11	15-Jul-11	Concluida	C	GOP	P	-78.54440000	-0.28272100
192	EPMMOP-191-SAE-01-U	Repavimentación Av. 5 de Junio	km	2.40	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	Manuela Sáenz	Centro Histórico	El Sena		\$ 253,521.36	\$ 253,521.36	Ing. Arroyo Iván		22-Feb-11	08-Jul-11	Concluida	C	GOP	M	-78.51700000	-0.23305000
193	EPMMOP-192-EUG-08-U	Repavimentación Av. De Las Palmeras	km	0.87	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	Eugenio Espejo	Jipijapa	San José del Inca		\$ 294,844.04	\$ 294,844.04	CONSTRUCTORA TOACHI		13-Sep-11	12-Nov-11	Concluida	C	GOP	M	-78.46614800	-0.15311300
194	EPMMOP-193-EUG-10-U	Sello Slurry Seal Av. La Coruña	km	0.50	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	Eugenio Espejo	Mariscal Sucre e Ñaquito	Varias		\$ 300,841.17	\$ 300,841.17			19-Oct-11	17-Ene-12	En ejecución (16%); se incremento el trabajo hasta la intersección con la Av. González Suárez.	E	GOP	M	-78.48270300	-0.19967800
195	EPMMOP-194-EUG-08-U	Repavimentación Av. Tomás de Berlanga	km	0.51	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	Eugenio Espejo	Jipijapa	Jipijapa		\$ 251,207.14	\$ 251,207.14			13-Sep-11	12-Nov-11	Concluida	C	GOP	M	-78.47860600	-0.16513400
196	EPMMOP-195-EUG-07-R	Repavimentación Av. Gaspar de Villarreal	km	1.20	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	Eugenio Espejo	Ñaquito	El Batán		\$ 170,000.00	\$ 170,000.00	Adm. Directa		11-Jul-11	10-Ago-11	Concluida	C	GOP	M	-78.47953500	-0.17022100
197	EPMMOP-196-CAL-01-R	Repavimentación Calle Duchicela	km	1,755.00	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	Calderón	Calderón	Centro	Urbano parroquial	\$ 680,000.00	\$ 680,000.00	Ing. Torres Diego		28-Sep-11	26-Ene-12	En ejecución (33%)	E	GOP	G	-78.47727800	-0.33720200
198	EPMMOP-197-EUG-09-U	Reconstrucción Calle De Los Nogales	m2	#####	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	Eugenio Espejo	Kennedy y San Isidro del Inca	Varios		\$ 419,916.64	\$ 419,916.64	Adm. Directa		04-Jul-11	03-Sep-11	Concluida	C	GOP	M	-78.46632900	-0.14833100
199	EPMMOP-198-ELO-09-U	Sello Slurry Seal Av. Ajaví	m2	#####	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	Eloy Alfaro	Solanda	Quito Sur		\$ 50,708.78	\$ 50,708.78	Adm. Directa		12-Jul-11	10-Ago-11	Concluida	C	GOP	P	-78.53766900	-0.26318300
200	EPMMOP-199-DEL-12-U	Repavimentación Calle Domingo Rengifo	km	0.53	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	La Delicia	Ponceano	Carcelén Alto		\$ 87,000.00	\$ 87,000.00	Adm. Directa		04-Jul-11	29-Abr-11	Concluida	C	GOP	P	-78.37194300	-0.21688500
201	EPMMOP-200-ELO-02-U	Repavimentación Av. Gualberto Pérez	km	0.86	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	Eloy Alfaro	Chimbacalle	El Camal		\$ 282,395.01	\$ 282,395.01	COANDES		28-Sep-11	27-Nov-11	Concluida	C	GOP	M	-78.51730100	-0.24948800
202	EPMMOP-201-ELO-02-U	Repavimentación Av. Napo	km	1.63	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	Eloy Alfaro	Chimbacalle	Varios		\$ 692,944.06	\$ 692,944.06			23-Sep-11	21-Ene-12	Concluida	C	GOP	G	-78.51310000	-0.24293000
203	EPMMOP-202-ELO-09-U	Repavimentación Av. Marquesa de Solanda	km	0.98	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	Eloy Alfaro	Solanda	Solanda		\$ 51,835.02	\$ 51,835.02			11-Oct-11	26-Oct-11	Obra contractual terminada, la señalización vertical y horizontal se ejecutará por Administración Directa.	C	GOP	P	-78.36052900	-0.17536000
204	EPMMOP-203-DEL-04-U	Repavimentación Calle José María Guerrero	km	1.93	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	La Delicia	Cotocolao	Cotocolao		\$ 334,409.98	\$ 334,409.98	Ing. Leopoldo Ocampo		13-Sep-11	22-Nov-11	Concluida	C	GOP	M	-78.49721800	-0.11765900
205	EPMMOP-204-DMQ	Provisión y transporte de mezcla asfáltica	m3	4,000	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 392,242.50	\$ 392,242.50	TEA		19-Ene-11	30-May-11	Concluida	C	GOP	M	NA	NA
206	EPMMOP-205-ELO-05-U	Repavimentación Av. Alonso de Angulo	m	1,300.00	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	Eloy Alfaro	La Magdalena	Varios		\$ 583,590.34	\$ 583,590.34	COANDES Cía. Ltda. (Ing. Jaime Durán Abad)		26-Sep-11	24-Ene-12	Obra contractual concluida, la Administración Zonal se encuentra trabajando en la reposición de aceras, no se puede concluir la señalización.	C	GOP	M	-78.52815700	-0.24861900
207	EPMMOP-206-ELO-02-U	Repavimentación Av. Ana Paredes de Alfaro	m	1,455.00	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	Eloy Alfaro	Chimbacalle	Varios		\$ 605,943.46	\$ 605,943.46	COANDES Cía. Ltda. (Ing. Jaime Durán Abad)		19-Sep-11	18-Dic-11	Concluida	C	GOP	M	-78.51260600	-0.24920500
208	EPMMOP-207-DEL-12-U	Repavimentación Calle San Francisco de Rumihurco	m	484.00	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	La Delicia	Ponceano	San José del Condado		\$ 103,109.55	\$ 103,109.55	Ing. Ocampo Andrade Leopoldo		28-Sep-11	12-Nov-11	Concluida	C	GOP	P	-78.49732900	-0.09850200



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
ING. GERMANICO PINTO TROYA
GERENTE GENERAL



N.	Código	Nombre del proyecto	Unidad de medida	Cantidad	Tipo de obra	Subtipo de obra	Adm. Zonal responsable	Ubicación Parroquia	Barrio	Ámbito Territorial (Aplica parroquias rurales)	Costo del proyecto	Presupuesto 2011	Contratista	Fecha de entrega de estudios	Inicio de Obra	Fin de Obra	Observaciones	Estado	Reporta	Tamaño	Longitud	Latitud
209	EPMMOP-208-EUG-02-U	Repavimentación Av. La Gasca	m	1,205.00	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	Eugenio Espejo	Belisario Quevedo	La Gasca		\$ 428,935.70	\$ 428,935.70	HINSA		19-Oct-11	28-Dic-11	Concluida	C	GOP	M	-78.50673400	-0.19552600
210	EPMMOP-209-EUG-02-U	Repavimentación Calle Ulloa	m	1,320.00	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	Eugenio Espejo	Belisario Quevedo	Varios		\$ 225,361.33	\$ 225,361.33	HINSA		11-Oct-01	10-Dic-11	Concluida	C	GOP	M	-78.49707900	-0.19308400
211	EPMMOP-210-EUG-14-U	Repavimentación Av. Brasil	m	2,850.00	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	Eugenio Espejo	Rumipamba	Varios		\$ 420,000.00	\$ 420,000.00	HINSA		19-Oct-11	17-Ene-12	Obra contractual terminada, la señalización vertical y horizontal se ejecutará por Administración Directa.	C	GOP	M	-78.48926000	-0.16456200
212	EPMMOP-211-SAE-01-U	Repavimentación Calle Ambato	m	776.00	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	Manuela Sáenz	Centro Histórico	San Sebastián		\$ 60,736.49	\$ 60,736.49	Constructora CVA S.A.		28-Sep-11	13-Oct-11	Concluida	C	GOP	P	-78.51755500	-0.22373100
213	EPMMOP-212-QUI-01-U	Repavimentación Calle Carlos Freile	m	1,983.00	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	Quitumbe	Chillogallo	Chillogallo		\$ 398,071.94	\$ 398,071.94	Constructora CVA S.A.		28-Sep-11	07-Dic-11	Concluida	C	GOP	M	-78.56437800	-0.28731700
214	EPMMOP-213-DEL-04-U	Repavimentación Machala	m	2,630.00	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	La Delicia	Cotacollo	Quito Norte		\$ 385,923.91	\$ 385,923.91	HINSA		10-Nov-11	19-Ene-12	En ejecución (70%)	E	GOP	M	-78.49926944	-0.11651389
215	EPMMOP-214-DEL-04-U	Repavimentación Pedro Freile	m	831.00	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	La Delicia	Cotacollo	Cotacollo		\$ 116,122.45	\$ 116,122.45	ING. LEOPOLDO OCAMPO		18-Nov-11	18-Dic-11	Obra contractual terminada, la señalización vertical y horizontal se ejecutará por Administración Directa.	C	GOP	P	-78.49540000	-0.12502222
216	EPMMOP-215-SAE-05-U	Repavimentación Guatemala	m	857.00	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	Manuela Sáenz	San Juan	Varios		\$ 136,383.99	\$ 136,383.99	CONSTRUCTORA VILLACRESESE-ANDRADE		21-Oct-11	05-Dic-11	Concluida	C	GOP	P	-78.51238056	-0.21120833
217	EPMMOP-216-QUI-01-U	Repavimentación Julián Estrella	m	1,726.00	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	Quitumbe	Chillogallo	Varios		\$ 319,545.98	\$ 319,545.98	CONSTRUCTORA CVA S.A.		10-Nov-11	20-Dic-11	Concluida	C	GOP	M	-78.55873889	-0.27922500
218	EPMMOP-217-Varias	Repavimentación Los Ríos	m	1,803.00	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	Manuela Sáenz	Itchimbia Centro Histórico	Varios		\$ 112,918.92	\$ 112,918.92	CONSTRUCTORA VILLACRESESE-ANDRADE		18-Nov-11	17-Ene-12	Se reinicia trabajos. En ejecución (65%)	E	GOP	P	-78.50396111	-0.21795000
219	EPMMOP-218-TUM-02-R	Sello Slurry Seal Vía Interoceánica	Km	5.80	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	Tumbaco	Cumbayá	Varios	Periférico rural	\$ 232,000.00	\$ 232,000.00	OCIVIALCO Construcciones Civiles		21-Nov-11	20-Ene-12	En ejecución (13%)	E	GOP	M	-78.44380833	-0.19596111
220		Repavimentación de la Calle Manta	m	364.00	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	La Delicia	Cotacollo	Cotacollo		\$ 51,357.20	\$ 51,357.20	OCAMPO	Estudios entregados	40876	40896	Concluida	C	GOP	P	Por definir	Por definir
221		Repavimentación de la Calle Sabanilla	m	390.00	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	La Delicia	Cotacollo	Varios		\$ 68,017.11	\$ 68,017.11	OCAMPO	Estudios entregados	40871	40891	Concluida	C	GOP	P	Por definir	Por definir
222		Repavimentación de la Calle Alonso de Pereira	m	481.00	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	Eugenio Espejo	Iñaquito	Iñaquito Bajo		\$ 67,914.72	\$ 67,914.72	TOACHI CIA. LTDA.	Estudios entregados	40848	40878	Obra contractual terminada, la señalización vertical y horizontal se ejecutará por Administración Directa.	C	GOP	P	Por definir	Por definir
223		Repavimentación calle Nariz del Diablo	m	1,804.00	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	Eloy Alfaro	La Ferrovial	Chaguarquingo		\$ 419,350.34	\$ 419,350.34	COANDES CIA. LTDA.	Estudios entregados	40875	40935	En ejecución (40%)	E	GOP	M	Por definir	Por definir
224		Repavimentación calle Carcelén Bajo calle N91	m	703.00	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	La Delicia	Carcelén	Carcelén Bajo		\$ 129,541.41	\$ 129,541.41	ING. LEOPOLDO OCAMPO	Estudios entregados	40884	40904	Obra contractual terminada, la señalización vertical y horizontal se ejecutará por Administración Directa.	C	GOP	P	Por definir	Por definir
225		Repavimentación calle Iñaquito	m	269.00	Movilidad y Transporte	Construcción y Mantenimiento Vial	Eugenio Espejo	Iñaquito	La Carolina		\$ 285,612.61	\$ 285,612.61	TOACHI CIA. LTDA.	Estudios entregados	40882	40927	En ejecución (5%)	E	GOP	M	Por definir	Por definir
226	EPMMOP-213-DMQ	Restricción vehicular en DMQ (Pico y Placa)	unidad	N/A	Movilidad y Transporte	Control en la vía pública	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 0.00	Administración Directa	Adm. Directa		Ene-11	Indefinida	Los vehículos detenidos desde el 24 de noviembre 2011 hasta el 23 de diciembre del 2011 son: primera vez 2,758, segunda vez 242, tercera vez 10, Total 3,010 vehículos. Total en lo que va del 2011 = 21,170	E	GGM	P	NA	NA



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
ING. GERMANICO PINTO TROYA
GERENTE GENERAL



N.	Código	Nombre del proyecto	Unidad de medida	Cantidad	Tipo de obra	Subtipo de obra	Adm. Zonal responsable	Ubicación Parroquia	Barrio	Ámbito Territorial (Aplica parroquias rurales)	Costo del proyecto	Presupuesto 2011	Contratista	Fecha de entrega de estudios	Inicio de Obra	Fin de Obra	Observaciones	Estado	Reporta	Tamaño	Longitud	Latitud
227	EPMMOP-214-DMQ	Control del Espacio Público (Vehículos mal estacionados-winchas)	unidad	N/A	Movilidad y Transporte	Control en la vía pública	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	Adm. Directa		Ene-11	Indefinida	Los vehículos detenidos desde el 24 de noviembre 2011 hasta el 23 de diciembre del 2011 son: Río Coca 404; Cumandá 418; Iñaquito 774; La Y 315; Total 1.911 vehículos retenidos, Total en lo que va del 2011 = 28.430 vehículos.	E	GGM	G	NA	NA
228	EPMMOP-215-DMQ	Fiscalización del Transporte Público	unidad	N/A	Movilidad y Transporte	Control en la vía pública	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 0.00	Administración Directa	Adm. Directa		Ene-11	Indefinida	El número de las Operadoras fiscalizadas desde el mes de enero hasta el 22 de noviembre del 2011 son 89 operadoras	E	GGM	P	NA	NA
229	EPMMOP-216-DMQ	Erradicación del Transporte Informal	unidad	N/A	Movilidad y Transporte	Control en la vía pública	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 0.00	Administración Directa	Adm. Directa		Ene-11	Indefinida	En el periodo desde el 24 de noviembre 2011 hasta el 23 de diciembre del 2011 los resultados son : Vehículos revisados 3.790, Retenidos 266, Fugados 7, total 4.063 vehículos, Total operativo a la fecha Vehículos revisados 23.299, Retenidos 1.522, Fugados 37. Total 24.858 vehículos	E	GGM	P	NA	NA
230	GEP-1-SAE-04-U	PARQUE CUSCUNGO: Primera Etapa, cerramiento, parqueaderos y caminería	Ha.	17.00	Espacio Público	Parques, Áreas verdes y recreativas	Manuela Sáenz	Pueng así	Primero de Mayo-Sector Monjas-Autopista General Rumiñahui y E 18 Mariano Hinojosa		\$ 108,108.56	\$ 108,108.56	Ing. Leopoldo Ocampo	01-Dic-10	03-Dic-10	31-Ene-11	Primera etapa concluida	C	GEP	P	-78.485802	-0.231562
231	GEP-2-SAE-04-U	PARQUE CUSCUNGO: Segunda Etapa, construcción de 2 módulos de servicios, caminería, canchas deportivas, módulo de Administración	Ha.	17.00	Espacio Público	Parques, Áreas verdes y recreativas	Manuela Sáenz	Pueng así	Primero de Mayo-Sector Monjas-Autopista General Rumiñahui y E 18 Mariano Hinojosa		\$ 367,225.41	\$ 117,225.41	Ing. Washington Efraín Andrango		29-Dic-10	01-Feb-12	Segunda etapa concluida	C	GEP	M	-78.485802	-0.231562
232	GEP-3-ELO-06-R	PARQUE CHILIBULO: Primera Etapa, cerramiento, parqueadero	Ha.	313.00	Espacio Público	Parques, Áreas verdes y recreativas	Eloy Alfaro	La Mena	Protección Ecológica la Mena-Calle Toca		\$ 212,613.17	\$ 212,613.17	Ing. Patricio Verdugo R.	22-Nov-10	03-Dic-10	15-Jun-11	Primera etapa concluida	C	GEP	M	-78.56211	-0.251738



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
ING. GERMANICO PINTO TROYA
GERENTE GENERAL



N.	Código	Nombre del proyecto	Unidad de medida	Cantidad	Tipo de obra	Subtipo de obra	Adm. Zonal responsable	Ubicación Parroquia	Barrio	Ámbito Territorial (Aplica parroquias rurales)	Costo del proyecto	Presupuesto 2011	Contratista	Fecha de entrega de estudios	Inicio de Obra	Fin de Obra	Observaciones	Estado	Reporta	Tamaño	Longitud	Latitud
233	GEP-4-ELO-06-R	PARQUE CHILIBULO: Segunda Etapa, construcción de un módulo de servicios y mejoramiento del empedrado de la vía de acceso, construcción del UPC, oficinas de administración	Ha.	313.00	Espacio Público	Parques, Áreas verdes y recreativas	Eloy Alfaro	La Mena	Protección Ecológica la Mena-Calle Toca		\$ 378,935.96	\$ 58,935.96	Ing. Boris Rolando Pazmiño Revelo		21-Abr-11	Por definir	El contrato de módulos de servicio fue rescindido por incumplimiento del contratista. Se está trabajando con la comunidad, IMUQ, Administración Eloy Alfaro y otros actores para definir las obras a realizarse en la tercera etapa. Además, se están elaborando TDRs para el levantamiento topográfico para luego trabajar en el diseño de la faja de la parte baja del parque que es colindante con las construcciones.	E	GEP	M	-78.56211	-0.251738
234	GEP-5-CHI-03-R	PARQUE ARMENIA LUCIANO ANDRADE MARÍN: Primera etapa, Implementación de accesos peatonales y vehiculares para el parque	Ha.	48.00	Espacio Público	Parques, Áreas verdes y recreativas	Los Chillos	Conocoto	S/N 64 - ARMENIA I	Urbano parroquial	\$ 201,842.68	\$ 201,842.68	EGARCO CIA. LTDA.	30-Sep-10	29-Dic-10	17-Jun-11	Obras de primera etapa concluidas	C	GEP	M	-78.47029	-0.270168
235	GEP-6-CHI-03-R	PARQUE LA ARMENIA Segunda etapa, módulos de servicios, señalética, 60 y piquito, mobiliario y juegos infantiles.	Ha.	48.00	Espacio Público	Parques, Áreas verdes y recreativas	Los Chillos	Conocoto	S/N 64 - ARMENIA I	Urbano parroquial	\$ 250,000.00	\$ 115,693.24	Ing. Fernando Almeida Hernández	22-Nov-10	24-Ene-11	10-Ago-11	Obras de segunda etapa concluidas	C	GEP	M	-78.4724	-0.300598
236		PARQUE LA ARMENIA Tercera etapa, Cerramiento, baterías sanitarias y pérgolas.	Ha.	48.00	Espacio Público	Parques, Áreas verdes y recreativas	Los Chillos	Conocoto	S/N 64 - ARMENIA I	Urbano parroquial	\$ 0.00	\$ 0.00	Por definir		13-Feb-12	04-May-12	Se ha definido iniciar la ejecución del cerramiento en la zona oriental del parque por administración directa, el resto del perímetro se ejecutará con un cerramiento modular móvil por futuras reformas geométricas.	P	GEP	P	-78.4724	-0.300598
237	GEP-7-QUI-04-U	Plaza Quitumbe	Ha.	51.00	Espacio Público	Plazas y Plazoletas	Quitumbe	Quitumbe	Lira Ñan y Quitumbe Ñan y Pachama		\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	Constructora Durango Vela y	29-Jul-11	12-Oct-11	Por definir	La obra de ductos para soterramiento fue culminada. La ejecución de módulos de servicio tiene un avance del 40%. La plataforma provisional fue concluida para fiestas de Quito.	E	GEP	M	-78.5471757	-0.29516639
238	GEP-8-EUG-14-U	Parque Rumipamba.- Caminerías y cerramientos	Ha.	43.00	Espacio Público	Parques, Áreas Verdes y Recreativas	Rumipamba	Rumipamba	Rumipamba		\$ 500,000.00		Por definir	29-Sep-11	19-Mar-12	12-Oct-12	Documentación lista para iniciar el proceso precontractual de la contratación de cerramiento en la calle Francisco Cruz Miranda, ampliación de aceras, implementación de Ciclo vía y portones de ingreso.	P	GEP	M	Por definir	Por definir



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
ING. GERMANICO PINTO TROYA
GERENTE GENERAL



N.	Código	Nombre del proyecto	Unidad de medida	Cantidad	Tipo de obra	Subtipo de obra	Adm. Zonal responsable	Ubicación Parroquia	Barrio	Ámbito Territorial (Aplica parroquias rurales)	Costo del proyecto	Presupuesto 2011	Contratista	Fecha de entrega de estudios	Inicio de Obra	Fin de Obra	Observaciones	Estado	Reporta	Tamaño	Longitud	Latitud
239	GEP-9-QUI-05-U	Parque Metropolitano Del Sur (Turubamba, Conocoto, Amaguaña).- Fase 1, estacionamientos, baterías sanitarias y pérgolas.	Ha.	670.00	Espacio Público	Parques, Áreas Verdes y Recreativas	Quitumbe	Turubamba, Conocoto, Amaguaña.	Protección Ecológica Quitumbé- Av. Libertad o Simón Bolívar	Periférico rural	\$ 600,000.00		Por definir	25-Nov-11	28-Feb-12	24-Sep-12	Pliegos listos para la contratación de construcción de los estacionamientos, módulos de servicios, rehabilitación del empedrado del camino de acceso a la casa mirador y cerramiento. En espera de la emisión de la partida presupuestaria para iniciar el proceso precontractual. Ejecución por administración directa de la readecuación de la casa mirador tiene un avance del 20%.	P	GEP	M	-78.5152319	-0.33083786
240	GEP-10-EUG-07-R	Parque Metropolitano Guangüiltagua.- Estacionamientos, baterías sanitarias y pérgolas	Ha.	549.92	Espacio Público	Parques, Áreas Verdes y Recreativas	Eugenio Espejo	Iñaquito	Protección Bellavista		\$ 300,000.00		Por definir	26-Oct-11	16-Ene-12	16-Mar-12	Por procesos de contratación no se ejecutará la instalación de mobiliario urbano y baterías sanitarias. Se está realizando por administración directa la colocación de adoquines en aceras y remodelación de construcciones existentes en el parqueadero Chuquipata.	P	GEP	M	-78.4633911	-0.17950697
241	GEP-11-CAL-01-R	Parque Metropolitano de Calderón	Ha.	500.00	Espacio Público	Parques, Áreas Verdes y Recreativas	Calderón	Calderón	Calderón	Urbano parroquial	\$ 40,000.00		Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	No se tiene presupuesto para la contratación de consultoría, se intervendrá el próximo año.	P	GEP	P	Por definir	Por definir
242	GEP-12-TUM-02-R	Parque Metropolitano de Lumbisí I Etapa	Ha.	Por definir	Espacio Público	Parques, Áreas Verdes y Recreativas	Tumbaco	Cumbayá	Lumbisí	Urbano parroquial	\$ 250,000.00						No se ejecutará este proyecto por no aprobación por parte de la Comunidad	S	GEP	M	Por definir	Por definir
243	GEP-13-DEL-02-U	Parque Carcelén BEV (Parque Central de Carcelén)	Ha.	71.50	Espacio Público	Parques, Áreas Verdes y Recreativas	La Delicia	Carcelén	Carcelén BEV		\$ 400,000.00	\$ 37,000.00	Arq. Manuel Uribe	13-Ene-12	Por definir	Por definir	Estudios en ejecución, se entregó el plan masa y aprobación del anteproyecto de la primera etapa, los mismos que fueron socializados en la Administración La Delicia.	P	GEP	M	-78.4705098	-0.08851344
244	GEP-14-DEL-12-U	Parque Carcelén Industrial (segunda y tercera etapas)	m ²	Por definir	Espacio Público	Parques, Áreas Verdes y Recreativas	La Delicia	Ponceano	Carcelén FV Ponce Calle Vicente Duque, Joaquín Mancheno y Tadeo Benítez		\$ 138,922.21	\$ 138,922.21	Ing. Rodríguez Cruz Diego	Recibidos por el IMUQ	16-Jun-11	Por definir	El contratista no ha cumplido con la ejecución de la obra, por tanto se está solicitando la rescisión unilateral del contrato.	S	GEP	P	-78.4769363	-0.09657919
245	GEP-15-TUM-02-R	Parque Mina de Cumbayá	Ha.	2.10	Espacio Público	Parques, Áreas Verdes y Recreativas	Tumbaco	Cumbayá	Cumbayá	Urbano parroquial	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	Arq. Esteban Jaramillo	15-Feb-12	Por definir	Por definir	Proceso Precontractual para la contratación de la consultoría del diseño arquitectónico paisajístico.	P	GEP	P	Por definir	Por definir
246	GEP-16-EUG-04-U	Parque de Atucucho	m ²	4,607.43	Espacio Público	Parques, Áreas Verdes y Recreativas	Eugenio Espejo	Cochabamba	Atucucho		\$ 122,000.00		Por definir		Por definir	Por definir	Se realizarán los estudios para determinar el área para expropiación.	P	GEP	P	Por definir	Por definir
247	GEP-17-ELO-02-U	Parque Pio XII Etapa I	m ²	8,755.00	Espacio Público	Parques, Áreas Verdes y Recreativas	Eloy Alfaro	Chimbacalle	Pio XII		\$ 150,000.00		Por definir	02-Dic-11	12-Mar-12	05-Oct-12	Terminados los estudios definitivos y están listos los pliegos para contratar la ejecución una vez que se cuente con la partida presupuestaria.	P	GEP	M	Por definir	Por definir



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
ING. GERMANICO PINTO TROYA
GERENTE GENERAL



N.	Código	Nombre del proyecto	Unidad de medida	Cantidad	Tipo de obra	Subtipo de obra	Adm. Zonal responsable	Ubicación Parroquia	Barrio	Ámbito Territorial (Aplica parroquias rurales)	Costo del proyecto	Presupuesto 2011	Contratista	Fecha de entrega de estudios	Inicio de Obra	Fin de Obra	Observaciones	Estado	Reporta	Tamaño	Longitud	Latitud
248	GEP-18-EUG-09-U	Parque Matovelle	Ha.	1.40	Espacio Público	Parques, Áreas Verdes y Recreativas	Eugenio Espejo	Kenedy	Matovelle Calle E10B-Asunos y N50H Los Álamos		\$ 200,000.00	\$ 4,316.00	Arq. Patricio Serrano	09-Dic-11	19-Mar-12	31-Ago-12	Estudios definitivos entregados para la elaboración de informes correspondientes.	P	GEP	M	-78.5464	-0.276796
249	GEP-19-SAE-05-U	Parque América	m ²	6,700.00	Espacio Público	Parques, Áreas Verdes y Recreativas	Manuela Sáenz	San Juan	Benito Juárez-N17-Rio de Janeiro, y Oe 5 México		\$ 200,000.00		Por definir	09-Dic-11	19-Mar-12	31-Ago-12	Terminados estudios definitivos y elaborando presupuesto para completar TDRs y pliegos para contratación de obra.	P	GEP	M	-78.49518	-0.253068
250	GEP-20-ELO-02-U	Intervención urbana y estudios para el soterramiento de Centro Sur Av. Napo	Km.	3.60	Espacio Público	Parques, Áreas Verdes y Recreativas. Aceras y Bordillos	Eloy Alfaro	Chimbacalle	La México, Chimbacalle, Luluncoto, Villa Flora		\$ 400,000.00		Por definir		Por definir	Por definir	Avance del estudio arquitectónico y de ingenierías 50%. Proceso precontractual podría iniciarse a partir de febrero siempre y cuando se priorice la asignación de recursos para este proyecto. El miércoles 21 de diciembre se presentó el anteproyecto al Administrador de la Zona Eloy Alfaro.	P	GEP	M	-78.5124663	-0.24182028
251	GEP-21-ELO-09-U	Parque Rumichaca Nan	m ²	3,850.00	Espacio Público	Parques, Áreas Verdes y Recreativas	Eloy Alfaro	Solanda	Santa Rita-Rumichaca Nan y S27 Moro Moro		\$ 110,000.00	\$ 6,236.00	Arq. Patricio Serrano	02-Dic-11	Por definir	Por definir	Estudios arquitectónicos en proceso de diseño.	P	GEP	P	-78.4207	-0.106856
252	GEP-22-QUI-04-U	Parque Paccari Llacta	m ²	8,600.00	Espacio Público	Parques, Áreas Verdes y Recreativas	Quitumbe	Quitumbe	Quitumbe Calle Otoya Nan y calle S34-B Cari		\$ 220,000.00	\$ 5,446.00	Arq. Juan Fernando Landázuri	30-Dic-11	Por definir	Por definir	Estudios arquitectónicos en proceso de diseño.	P	GEP	M	-78.51624	-0.329165
253	GEP-23-SAE-04-U	Parque Obrero Independiente	Ha.	1.80	Espacio Público	Parques, Áreas Verdes y Recreativas	Manuela Sáenz	Puengasí	S/N 53 calle Juan Bautista Aguirre		\$ 125,000.00	\$ 4,036.00	Arq. Juan Fernando Landázuri	30-Dic-11	Por definir	Por definir	Estudios arquitectónicos en proceso de diseño. Se está coordinando con EMSEGURIDAD ya que este parque ha sido seleccionado como un punto seguro.	P	GEP	P	-78.5435	-0.295094
254	GEP-24-QUI-03-U	Parque Turubamba de Monjas 1	Ha.	1.60	Espacio Público	Parques, Áreas Verdes y Recreativas	Quitumbe	La Ecuatoriana	La Ecuatoriana-Calles OE8 Camino Orejuela y Calle S 47		\$ 135,000.00	\$ 3,336.00	Arq. Edwin Cevallos	30-Dic-11	Por definir	Por definir	Estudios arquitectónicos en proceso de diseño.	P	GEP	P	-78.5052	-0.207922
255	GEP-25-ELO-03-U	Parque Chino -Sur	m ²	9,644.00	Espacio Público	Parques, Áreas Verdes y Recreativas	Eloy Alfaro	La Argelia	Unión y Justicia, San Bartolo		\$ 6,236.00	\$ 6,236.00	Arq. Patricio Serrano	30-dic-11	Por definir	Por definir	Estudios arquitectónicos en proceso de diseño.	P	GEP	P	-78.4594	-0.154782
256	GEP-26-DEL-13-R	Parque Catequillá	Ha.	2.20	Espacio Público	Parques, Áreas Verdes y Recreativas	La Delicia	San Antonio	Carcelén Bajocalles SIC y calle E6H Quisquis	Urbano parroquial	\$ 260,000.00	\$ 7,216.00	Arq. Andrea Fierro	02-Dic-11	Por definir	Por definir	Estudios concluidos, en proceso de revisión.	P	GEP	M	-78.5302	-0.281174



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
ING. GERMANICO PINTO TROYA
GERENTE GENERAL



N.	Código	Nombre del proyecto	Unidad de medida	Cantidad	Tipo de obra	Subtipo de obra	Adm. Zonal responsable	Ubicación Parroquia	Barrio	Ámbito Territorial (Aplica parroquias rurales)	Costo del proyecto	Presupuesto 2011	Contratista	Fecha de entrega de estudios	Inicio de Obra	Fin de Obra	Observaciones	Estado	Reporta	Tamaño	Longitud	Latitud
257	GEP-27-SAE-03-U	Parque La Lorena	Ha.	1.10	Espacio Público	Parques, Áreas Verdes y Recreativas	Manuela Sáenz	La Libertad	Lomas de Puengasí		\$ 150,000.00	\$ 7,216.00	Arq. Andrea Fierro	30-dic-11	Por definir	Por definir	Estudios concluidos, en proceso de revisión.	P	GEP	M	-78.56329	-0.313598
258	GEP-28-CHI-03-R	Parque Los Arupos de Conocoto	Ha.	1.90	Espacio Público	Parques, Áreas Verdes y Recreativas	Los Chillos	Conocoto	Calle Manuela Sáenz y Salinas	Urbano parroquial	\$ 220,000.00	\$ 5,716.00	Arq. Edwin Cevallos	30-dic-11	Por definir	Por definir	Estudios arquitectónicos en proceso de diseño.	P	GEP	M	-78.4404	0.00487208
259	GEP-29-DEL-11-R	Parque Los Shirys	Ha.	3.90	Espacio Público	Parques, Áreas Verdes y Recreativas	La Delicia	Pomasqui	Pomasqui	Urbano parroquial	\$ 90,000.00	\$ 3,336.00	Arq. Andrea Fierro	Por definir	Por definir	Por definir	Estudios en ejecución.	P	GEP	P	-78.4196	-0.211067
260	GEP-30-EUG-08-U	Parque República de Bolivia	m ²	1,560.00	Espacio Público	Parques, Áreas Verdes y Recreativas	Eugenio Espejo	Jipijapa	Jipijapa, Pasaje Isla Tortuga y Seymor		\$ 80,000.00		Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Se aprobó en Concejo la ubicación del terreno destinado para el parque. Estudios definitivos elaborados y se requiere presupuesto para la ejecución en el 2012.	P	GEP	P	-78.4802518	-0.16641025
261	GEP-31-EUG-14-U	Parque República de Panamá	m ²	621.36	Espacio Público	Parques, Áreas Verdes y Recreativas	Eugenio Espejo	Rumipamba	Quito Tennis Av. Mariscal Antonio José de Sucre y N42 Beck Rollo		\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	Administración Directa		21-Mar-11	02-Dic-11	Obra concluida	C	GEP	P	-78.4955074	-0.16342144
262	GEP-32-DMQ	Parques Inclusivos - 60 y Piquito	unidades	85	Espacio Público	Parques, Áreas Verdes y Recreativas	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	Varios		20-May-11	31-Dic-11	Contratos suscritos y en ejecución. Equipos de gimnasia inclusiva están siendo entregados.	E	GEP	G	NA	NA
263	GEP-33-EUG-07-R	Soterramiento Polígono República de El Salvador	Km.	12.40	Espacio Público	Aceras y Bordillos	Eugenio Espejo	Iñaquito	Benalcázar		\$ 5,850,452.48	\$ 2,340,180.99	RIPCONCIV		02-Ene-12	06-Sep-12	Se suscribió convenio entre EPMAPS y EPMMOP para construir red terciaria de alcantarillado junto con el soterramiento por un monto de \$515,000.00. Debido a los resultados del proceso de socialización se ha propuesto aplazar el inicio de las obras para el 2 de enero según demanda de la comunidad. La contratación para fiscalización de la obra está en proceso de adjudicación.	P	GEP	G	-78.4801548	-0.18077486
264	GEP-34-EUG-10-U	Soterramiento Polígono La Mariscal - Polígono 1	Km.	5.00	Espacio Público	Aceras y Bordillos	Eugenio Espejo	Mariscal Sucre	La Mariscal		\$ 60,000.00		Por definir	02-Dic-11	23-Abr-12	05-Oct-12	Polígono 1: Pliegos para contratación de obra en proceso de elaboración. La EPMAPS se comprometió a entregar los volúmenes aproximados de los rubros para la construcción de la red terciaria de alcantarillado para el sector. Está en elaboración el presupuesto referencial de los rubros correspondientes a la intervención arquitectónica. Polígono 2 y 3: Estudios de Ingenierías en proceso. Planos arquitectónicos listos.	P	GEP	P	Por definir	Por definir



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
ING. GERMANICO PINTO TROYA
GERENTE GENERAL



N.	Código	Nombre del proyecto	Unidad de medida	Cantidad	Tipo de obra	Subtipo de obra	Adm. Zonal responsable	Ubicación Parroquia	Barrio	Ámbito Territorial (Aplica parroquias rurales)	Costo del proyecto	Presupuesto 2011	Contratista	Fecha de entrega de estudios	Inicio de Obra	Fin de Obra	Observaciones	Estado	Reporta	Tamaño	Longitud	Latitud
265	GEP-35-DMQ	Pozos e invernaderos para viveros municipales: Tumbaco, Quitumbe y Los Chillos	unidades	5	Espacio Público	Invernaderos	DMQ	DMQ	Cununya cu, Caupichu y Armenia	Periférico rural	\$ 300,000.00		Por definir		Por definir	Por definir	Contratación para pozos fue adjudicado y para invernaderos está en proceso de presentación de ofertas.	P	GEP	M	NA	NA
266	GEP-36-DMQ	Mobiliario Urbano	unidades	2,567	Espacio Público	Parques, Áreas Verdes y Recreativas	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 1,000,000.00	\$ 500,000.00	Por definir		Por definir	Por definir	Se están receptando ofertas.	P	GEP	G	NA	NA
267	GEP-37-DMQ	Nomenclatura: suburbanas DMQ	unidades	58,270	Espacio Público	DMQ.	DMQ	DMQ	DMQ		\$ 500,000.00	\$ 400,000.00	Varios		01-Mar-11	29-Feb-12	Placas fabricadas entre viales y prediales; San Antonio #1630, Calderón #34620, Cumbayá #1506, Tumbaco #6231 y Amaguaña #7900. Placas instaladas entre viales y prediales; San Antonio #1680, Calderón #13500, Cumbayá #270.	E	GEP	M	NA	NA
268	GEP-38-EUG-14-U	Parque Guatemala	m ²	2,253.02	Espacio Público	Parques, Áreas verdes y recreativas	Eugenio Espejo	Rumipamba	Unión Nacional N44- Carvajal y Av. Mariscal Antonio José de Sucre		\$ 30,101.14	\$ 30,101.14	Administración Directa	30-Jun-11	01-Mar-11	13-May-11	Obra concluida	C	GEP	P	-78.4953967	-0.16147708
269	GEP-39-SAE-05-U	Parque García Moreno	m ²	5,386.02	Espacio Público	Parques, Áreas verdes y recreativas	Manuela Sáenz	San Juan	San Juan Oe4 Venezuela y N11D Caldas		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	Por Definir	30-Jun-11	Por Definir	Por Definir	Trabajos de mantenimiento de la jardinería del Parque, implantación de un nuevo diseño de ornamentación y poda formativa fueron terminados. Los estudios de iluminación tienen un avance del 80%.	P	GEP	P	-78.4358	-0.014654
TOTAL GENERAL											\$ 365,699,626	\$ 156,235,643										
